#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário
1	**Total**		1273,3d	22-Jun-26 12:00 AM A	16-Dez-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
2	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2 5900.0000001.00.7 # EPC 07 - EXPEDIÇÃO P**		1273,3d	22-Jun-26 12:00 AM A	16-Dez-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
3	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.9 MARCOS DO PROJETO**		1273,3d	22-Jun-26 12:00 AM	16-Dez-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
4	A1390	Inicio do Planejamento	0,0d	22-Jun-26 12:00 AM		[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
5	A1190	Formalização do Contrato para SRGE - (EM)	0,0d	22-Jun-26 08:00 AM*		[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
6	A1000	Início do Contrato (AS)	0,0d	20-Jul-27 08:00 AM		[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
7	A1030	Inicio Projeto Executivo	0,0d	18-Set-27 08:00 AM		[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
8	A5880	Escritório de Engenharia Funcional	0,0d		18-Set-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
9	A5890	Início do Projeto Executivo (LD)	0,0d		18-Set-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
10	A5950	Início Construção Civil Tanques (P-2008 A / B / C)	0,0d	22-Dez-27 08:00 AM		[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
11	A5900	Emissão da Ordem de Compra - Tanques	0,0d		16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
12	A5920	Emissão da Ordem de Compra - Agitadores	0,0d		16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
13	A5930	Emissão da Ordem de Compra - Instrumento Radar Nível Tanques	0,0d		16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
14	A5910	Emissão da Ordem de Compra - Bombas	0,0d		15-Fev-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
15	A5940	Início Adequação dos Tanques (P-104 E / F , P-12 A/ B)	0,0d	15-Fev-28 08:00 AM		[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
16	A5951	Término Construção Civil Tanques (P-2008 A / B / C)	0,0d		13-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
17	A5961	Início Montagem Eletromecânica (P-2008 A / B / C)	0,0d	03-Ago-28 08:00 AM		[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
18	A5943	Término Adequação dos Tanques (P-104 E / F , P-12 A/ B)	0,0d		15-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
19	A5962	Término Montagem Eletromecânica (P-2008 A / B / C)	0,0d		15-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
20	A6010	Término CCM - Completação Mecânica	0,0d		17-Jul-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
21	A6011	Partida - Expedição dutoviária	0,0d		17-Set-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
22	A1010	Encerramento do Contrato	0,0d		16-Dez-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
23	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.1 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO**		393,3d	22-Jun-26 12:00 AM A	20-Jul-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
24	A1475	Pastas do contrato na rede	2,0d	22-Jun-26 12:00 AM A	24-Jun-26 12:00 AM A	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
25	A1473	Término do Projeto Básico (RPBC/EM)	1,0d	22-Jun-26 12:00 AM A	22-Jun-26 12:00 AM A	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
26	A1482	GDBS - abertura da solicitação para licitação (SRGE/LSA)	10,0d	22-Jun-26 12:00 AM A	02-Jul-26 12:00 AM A	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
27	A1474	Emissão de listas e MCs no SIGEM (RPBC/EM)	5,0d	22-Jun-26 12:00 AM A	27-Jun-26 12:00 AM A	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
28	A1705	Conclusão de Anexos - Dutos - Rev zero	112,0d	22-Jun-26 08:00 AM	12-Out-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
29	A1570	Elaboração do Acordo de Nivel de Serviço (ANSE)	46,0d	22-Jun-26 08:00 AM	07-Ago-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
30	A1492	Maturidade do Projeto	60,0d	22-Jun-26 08:00 AM	21-Ago-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
31	A1481	Solicitar a OGM a criação de Pasta Calcula Recursos	5,0d	09-Jul-26 12:00 AM A	14-Jul-26 12:00 AM A	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
32	A1740	Cadastrar os quantitativos no SMEC (RPBC/EM)	19,0d	21-Ago-26 08:00 AM	09-Set-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
33	A1741	Preencher SMEC Disciplinas	7,0d	09-Set-26 08:00 AM	16-Set-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
34	A1742	Quantitativos planilhados-Preencher -MOI Geral (SRGE/PG)	7,0d	09-Set-26 08:00 AM	16-Set-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
35	A1743	Quantitativos planilhados-Preencher - MOI Projeto	7,0d	09-Set-26 08:00 AM	16-Set-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
36	A1850	Abertura do CSP para a EC - Catálogo de Serviços Petrobras (ORP)	2,0d	16-Set-26 08:00 AM	18-Set-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
37	A1744	Preencher Premissas	11,0d	16-Set-26 08:00 AM	27-Set-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
38	A1851	Recursos e Estimativa de Custos (EC)	20,0d	18-Set-26 08:00 AM	08-Out-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
39	A1852	ORP Referencial Aprovado	3,0d	27-Set-26 08:00 AM	30-Set-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
40	A1820	Análise de risco para o ON Demand (SRGE/PG)	5,0d	12-Out-26 08:00 AM	17-Out-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
41	A1830	Nota Técnica ON Demand (SRGE/PG)	7,0d	12-Out-26 08:00 AM	19-Out-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
42	A1840	Nota Técnica de Fluxo de Caixa	13,0d	12-Out-26 08:00 AM	25-Out-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
43	A1855	APROVAÇÃO DO SIAC	4,0d	15-Out-26 08:00 AM	19-Out-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
44	A1856	Publicação da licitação (SRGE/LSA)	3,0d	19-Out-26 08:00 AM	22-Out-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
45	A1881	Recebimento de Propostas (SRGE/PG)	150,0d	22-Out-26 08:00 AM	21-Mar-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
46	A1750	Preencher Calcula Recursos (SRGE)	20,0d	25-Out-26 08:00 AM	14-Nov-26 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
47	A1891	Assinatura de Contrato	120,0d	22-Mar-27 08:00 AM	20-Jul-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
48	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.4 MOBILIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA**		120,0d	20-Jul-27 08:00 AM	17-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
49	A1220	Mobilização de Canteiro / Equipes 1	60,0d	20-Jul-27 08:00 AM	18-Set-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
50	A1430	Mobilização de Canteiro / Equipe 2	60,0d	18-Set-27 08:00 AM	17-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D

Outubro 2029: S40 | S41

Trabalho Real · Trabalho Restante · Trabalho Restante Crítico · Marco · Resumo

TASK filter: Todas as Atividades

© Oracle Corporation

Outubro 2029 | Novembro 2029 | Dezembro 2029 | Janeiro 2030

S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1

16-Dez-29 08:00 AM, Total

16-Dez-29 08:00 AM, RPBC-EXP-U6000-3-1-2 5900.0000001.00.7 # E

16-Dez-29 08:00 AM, RPBC-EXP-U6000-3-1-2.9 MARCOS DO PROJE

Encerramento do Contrato

© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário
51		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**	450,0d	20-Jul-27 08:00 AM	12-Out-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
52	A1209	Mobilização do projeto executivo (LD)	60,0d	20-Jul-27 08:00 AM	18-Set-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
53	A1230	Sondagem Geotécnica	30,0d	18-Set-27 08:00 AM	18-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
54	A1210	Projeto executivo - Documentos para aquisição	90,0d	18-Set-27 08:00 AM	17-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
55	A1060	As Built	300,0d	17-Dez-27 08:00 AM	12-Out-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
56	A1690	Ordem de Compra das J-4522 A/B - BOMBA DE DIESEL	60,0d	17-Dez-27 08:00 AM	15-Fev-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
57	A1050	Ordem de Compra demais Bens Tagueados	90,0d	17-Dez-27 08:00 AM	16-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
58	A1170	Ordem de Compra dos Tanques Novos P 2008 A/B/C.	30,0d	17-Dez-27 08:00 AM	16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
59	A5730	Ordem de compra AGITADORES	30,0d	17-Dez-27 08:00 AM	16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
60	A5740	Ordem de compra - Adequação Tanques P-12 A/B (INSTRUMENTOS/CALDEI	30,0d	17-Dez-27 08:00 AM	16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
61	A1200	Ordem de compra de Bens não tagueados	30,0d	17-Dez-27 08:00 AM	16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
62		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.3 SUPRIMENTOS**	390,0d	16-Jan-28 08:00 AM	09-Fev-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
63		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.3.1 BENS TAGUEADOS**	390,0d	16-Jan-28 08:00 AM	09-Fev-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
64	A1070	Recebimento chapas no fabricante P-2008 A / B / C - TANQUES NOVOS	120,0d	16-Jan-28 08:00 AM	15-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
65	A1380	Recebimento Equipamentos AGITADORES	150,0d	16-Jan-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
66	A1520	Recebimento Tubulação	150,0d	16-Jan-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
67	A1530	Recebimento Chaparia / Suportes	150,0d	16-Jan-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
68	A1080	Recebimento instrumento RADAR DE NIVEL	90,0d	16-Jan-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
69	A1180	Recebimento das J-4522 A/B - BOMBA DE DIESEL	360,0d	15-Fev-28 08:00 AM	09-Fev-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
70	A1120	Recebimento B-25124003 A - BOMBA DE ANTIOXIDADE	120,0d	16-Mar-28 08:00 AM	14-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
71	A1130	Recebimento B-25124003 B - BOMBA DE ANTIOXIDANTE	120,0d	16-Mar-28 08:00 AM	14-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
72	A1140	Recebimento FC - CONTROLADOR DE VAZÃO	90,0d	16-Mar-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
73	A1150	Recebimento FI - INDICADOR DE VAZÃO	90,0d	16-Mar-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
74	A1160	Recebimento FFC - CONTROLE DA RELAÇÃO DE VAZÃO	90,0d	16-Mar-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
75	A1460	Recebimento ISO TANQUE ANTI OXIDANTE	200,0d	16-Mar-28 08:00 AM	02-Out-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
76	A1510	Recebimento Transformador TF-3101	60,0d	16-Mar-28 08:00 AM	15-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
77	A1540	Recebimento Chapas fabricadas - Tanque A	15,0d	04-Jul-28 08:00 AM	19-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
78	A5680	Recebimento Chapas fabricadas - Tanque B	10,0d	04-Jul-28 08:00 AM	14-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
79	A5690	Recebimento Chapas fabricadas - Tanque C	5,0d	04-Jul-28 08:00 AM	09-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
80		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.3.2 BENS NÃO TAGUEADOS**	60,0d	16-Jan-28 08:00 AM	16-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
81	A5530	Recebimento Material Elétrico	60,0d	16-Jan-28 08:00 AM	16-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
82	A1560	Recebimento material TANQUE NÃO TAGUEADO	30,0d	16-Jan-28 08:00 AM	15-Fev-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
83		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.5 MONTAGEM CIVIL**	596,0d	24-Set-27 08:00 AM	12-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
84		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.5.1 TANQUE P-2008 A**	487,0d	17-Dez-27 08:00 AM	17-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
85	A1947	Limpeza e Demolição área tanque P-2008 A	5,0d	17-Dez-27 08:00 AM	22-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
86	A1949	Remover Tubulação Drenagem Existente P-2008 A	3,0d	22-Dez-27 08:00 AM	25-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
87	A1950	Escavação P-2008 A	9,0d	25-Dez-27 08:00 AM	03-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
88	A1952	Aterramento e Compactação P-2008 A	13,0d	03-Jan-28 08:00 AM	16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
89	A1953	Drenagem Tanque P-2008 A	20,0d	16-Jan-28 08:00 AM	05-Fev-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
90	A1960	Fundações da área do P-2008 A	20,0d	05-Fev-28 08:00 AM	25-Fev-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
91	A1961	Aterro da Área Interna do Anel P-2008 A	7,0d	25-Fev-28 08:00 AM	03-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
92	A1964	Piso Laje área Interna do Anel P-2008 A	5,0d	03-Mar-28 08:00 AM	08-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
93	A1965	Sub Dique P-2008 A	45,0d	08-Mar-28 08:00 AM	22-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
94	A1966	Recomposição e Execução de Taludes P-2008 A	9,0d	22-Abr-28 08:00 AM	01-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
95	A1990	Área de muro P-2008 A	12,0d	01-Maio-28 08:00 AM	13-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
96	A2000	Pavimentação da área do P-2008 A	2,0d	15-Abr-29 08:00 AM	17-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
97		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.5.2 TANQUE P-2008 B**	542,0d	17-Nov-27 08:00 AM	12-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
98	A2009	Adequações Drenagem - Caixas Novas - P-2008-B	9,0d	17-Nov-27 08:00 AM	26-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
99	A2010	Fundações ANEL P-2008 B	15,0d	26-Nov-27 08:00 AM	11-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
100	A2020	Piso Laje P-2008 B	6,0d	11-Dez-27 08:00 AM	17-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
101	A2021	Sub Dique P-2008 B	16,0d	17-Dez-27 08:00 AM	02-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D

Outubro 2029: S40 | S41

Trabalho Real · Trabalho Restante · Trabalho Restante Crítico · Marco · Resumo

TASK filter: Todas as Atividades

© Oracle Corporation

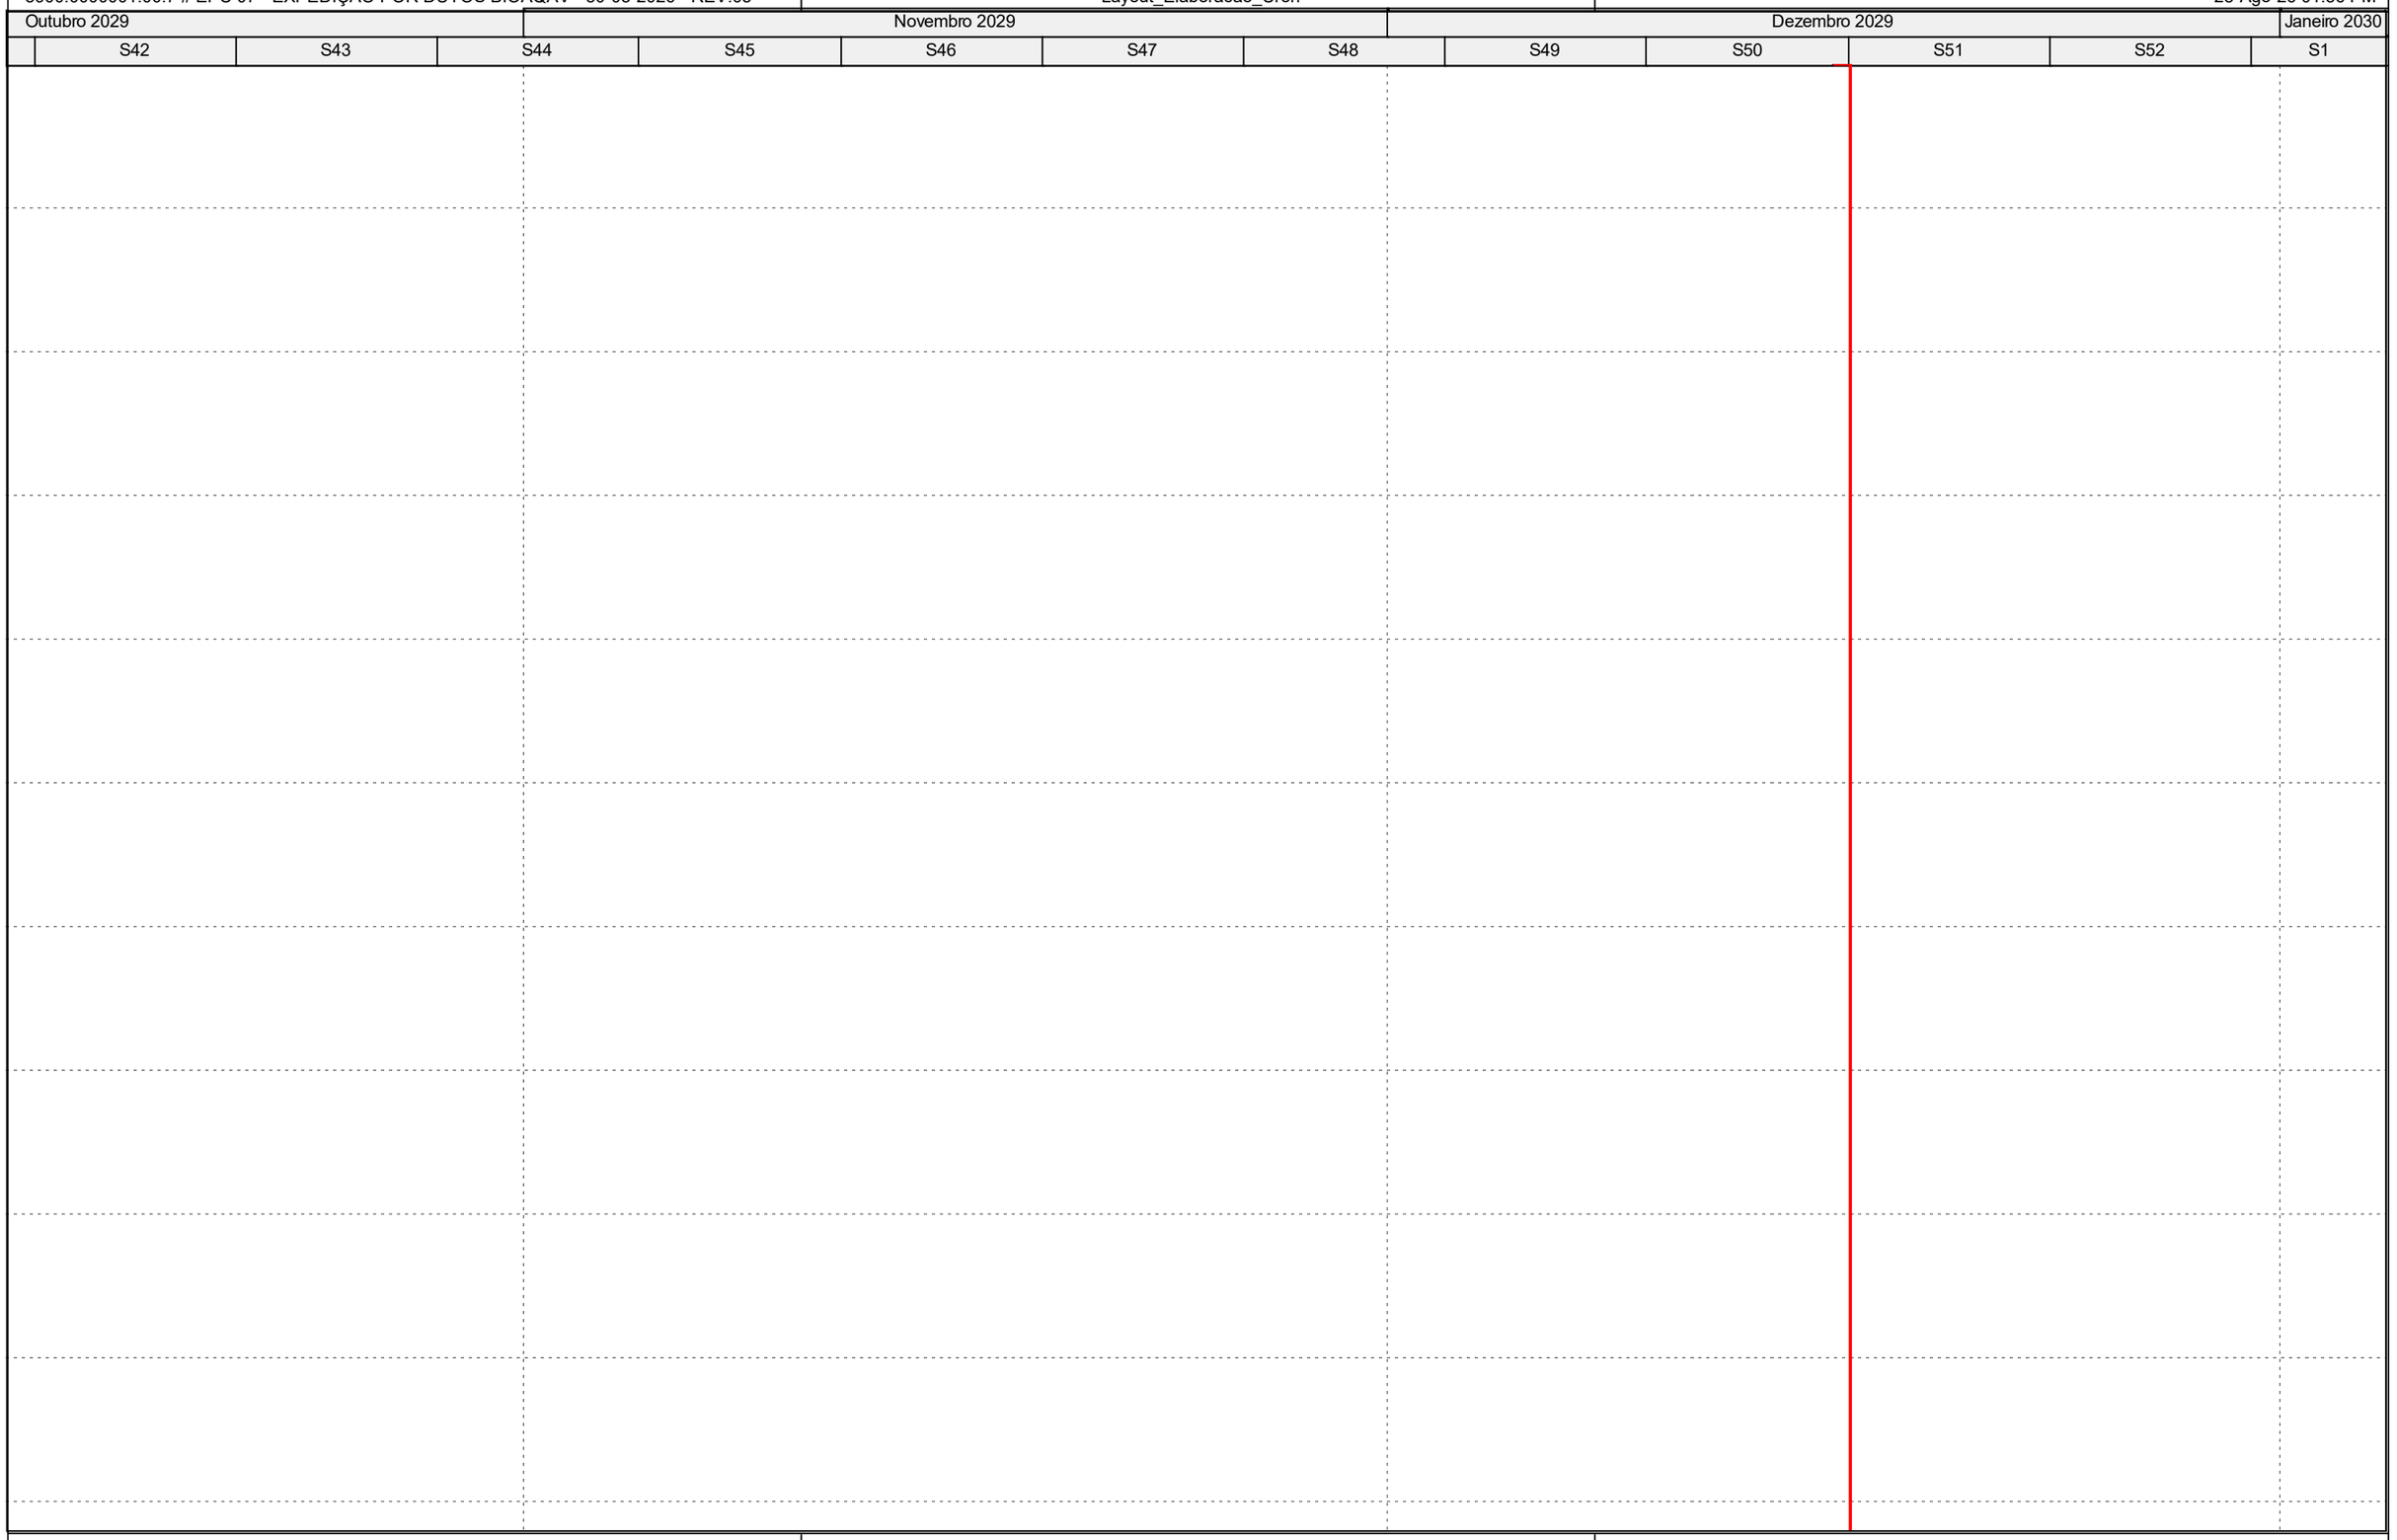

© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário	Outubro 2029	
							S40	S41
102	A2022	Execução de Taludes P-2008 B	5,0d	22-Abr-28 08:00 AM	27-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
103	A2060	Pavimentação da área P-2008 B	2,0d	10-Maio-29 08:00 AM	12-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
104	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.5.3 TANQUE P-2008 C**		477,0d	17-Dez-27 08:00 AM	07-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
105	A4530	Limpeza e Demolição área tanque P-2008 C	5,0d	17-Dez-27 08:00 AM	22-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
106	A4550	Remover tubulação drenagem existente P-2008 C	3,0d	22-Dez-27 08:00 AM	25-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
107	A4560	Escavação P-2008 C	9,0d	25-Dez-27 08:00 AM	03-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
108	A4570	Aterramento e Compactação P-2008 C	13,0d	03-Jan-28 08:00 AM	16-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
109	A4580	Drenagem Tanque P-2008-C	15,0d	16-Jan-28 08:00 AM	31-Jan-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
110	A4590	Fundações da área do P-2008 C	20,0d	31-Jan-28 08:00 AM	20-Fev-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
111	A4600	Aterro da área Interna do anel P-2008 C	7,0d	20-Fev-28 08:00 AM	27-Fev-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
112	A4610	Piso Laje área interna do Anel P-2008 C	5,0d	27-Fev-28 08:00 AM	03-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
113	A4620	Sub Dique P-2008 C	45,0d	03-Mar-28 08:00 AM	17-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
114	A4630	Recomposição e execução de taludes P-2008 C	9,0d	22-Abr-28 08:00 AM	01-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
115	A4650	Área de muro P-2008 C	12,0d	01-Maio-28 08:00 AM	13-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
116	A4660	Pavimentação da área do P-2008 C	2,0d	05-Abr-29 08:00 AM	07-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
117	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.5.4 TANQUE P-12 A/ B**		16,0d	17-Nov-27 08:00 AM	03-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
118	A2127	Demolição da área do P-12 A / B	1,0d	17-Nov-27 08:00 AM	18-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
119	A2128	Escavação área Tanque P-12 A / B	8,0d	18-Nov-27 08:00 AM	26-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
120	A2139	Aterro da área do P-12 A / B	2,0d	26-Nov-27 08:00 AM	28-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
121	A2150	Base e Sub Base RUA Travessia P-12 A / B	1,0d	28-Nov-27 08:00 AM	29-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
122	A2160	Recomposição de Talude área P-12 A / B	3,0d	29-Nov-27 08:00 AM	02-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
123	A2180	Pavimentação área do P-12 A / B	1,0d	02-Dez-27 08:00 AM	03-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
124	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.5.5 PÁTIO DE BOMBAS**		560,0d	24-Set-27 08:00 AM	06-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
125	A3392	Demolição base bomba existente J-4522 A	3,0d	24-Set-27 08:00 AM	27-Set-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
126	A3394	Escavação Bombas J-4522 A	2,0d	27-Set-27 08:00 AM	29-Set-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
127	A3396	Aterro Bombas J-4522 A	2,0d	29-Set-27 08:00 AM	01-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
128	A3398	Concretagem Base Bombas J-4522 A	3,0d	01-Out-27 08:00 AM	04-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
129	A3393	Demolição base bomba existente J-4522 B	5,0d	17-Mar-29 08:00 AM	22-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
130	A3395	Escavação Bombas J-4522 B	5,0d	22-Mar-29 08:00 AM	27-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
131	A3397	Aterro Bombas J-4522 B	5,0d	27-Mar-29 08:00 AM	01-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
132	A3399	Concretagem Base Bombas J-4522 B	5,0d	01-Abr-29 08:00 AM	06-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
133	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6 MONTAGEM ELÉTROMECÂNICA**		599,0d	27-Set-27 08:00 AM	18-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
134	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3 TANQUE P-12 A**		345,0d	02-Dez-27 08:00 AM	11-Nov-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
135	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.1 Equipamentos Mecânicos**		270,0d	15-Fev-28 08:00 AM	11-Nov-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
136	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.1.2 Mecânica Estáticos**		270,0d	15-Fev-28 08:00 AM	11-Nov-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
137	A	Liberação do sistema	15,0d	15-Fev-28 08:00 AM	01-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
138	A	Drenagem do Tanque P-12 A	45,0d	14-Jun-28 08:00 AM	29-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
139	A	Limpeza interna Tanque P-12 A	15,0d	29-Jul-28 08:00 AM	13-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
140	A	Adequação + instalação do agitador Tanque P-12 A	87,0d	13-Ago-28 08:00 AM	08-Nov-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
141	A	Testes e ensaios Tanque P-12 A	3,0d	08-Nov-28 08:00 AM	11-Nov-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
142	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.2 Tubulação**		82,0d	14-Jun-28 08:00 AM	04-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
143	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.2.1 Fabricação Tubulação**		27,0d	14-Jun-28 08:00 AM	11-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
144	A	Fabricação Tubulação - P-12 A	15,0d	14-Jun-28 08:00 AM	29-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
145	A	Fabricação Suportes Tubulação P-12 A	7,0d	14-Jun-28 08:00 AM	21-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
146	A	Testes Tubulação P-12 A	7,0d	29-Jun-28 08:00 AM	06-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
147	A	Pintura Tubulação P-12 A	5,0d	06-Jul-28 08:00 AM	11-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
148	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.2.2 Instalação Campo**		55,0d	11-Jul-28 08:00 AM	04-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
149	A	Instalação Suportes Tubulação Selo P-12 A / B	5,0d	11-Jul-28 08:00 AM	16-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
150	A	MONTAGEM TUBULAÇÃO SELO DE NAFTA - P-12 A / B - SAIDA DO TANQU	50,0d	16-Jul-28 08:00 AM	04-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
151	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.3 Instrumentação**		154,0d	16-Mar-28 08:00 AM	17-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
152	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.3.1 Infraestrutura instrumentação**		5,0d	16-Mar-28 08:00 AM	21-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		

© Oracle Corporation

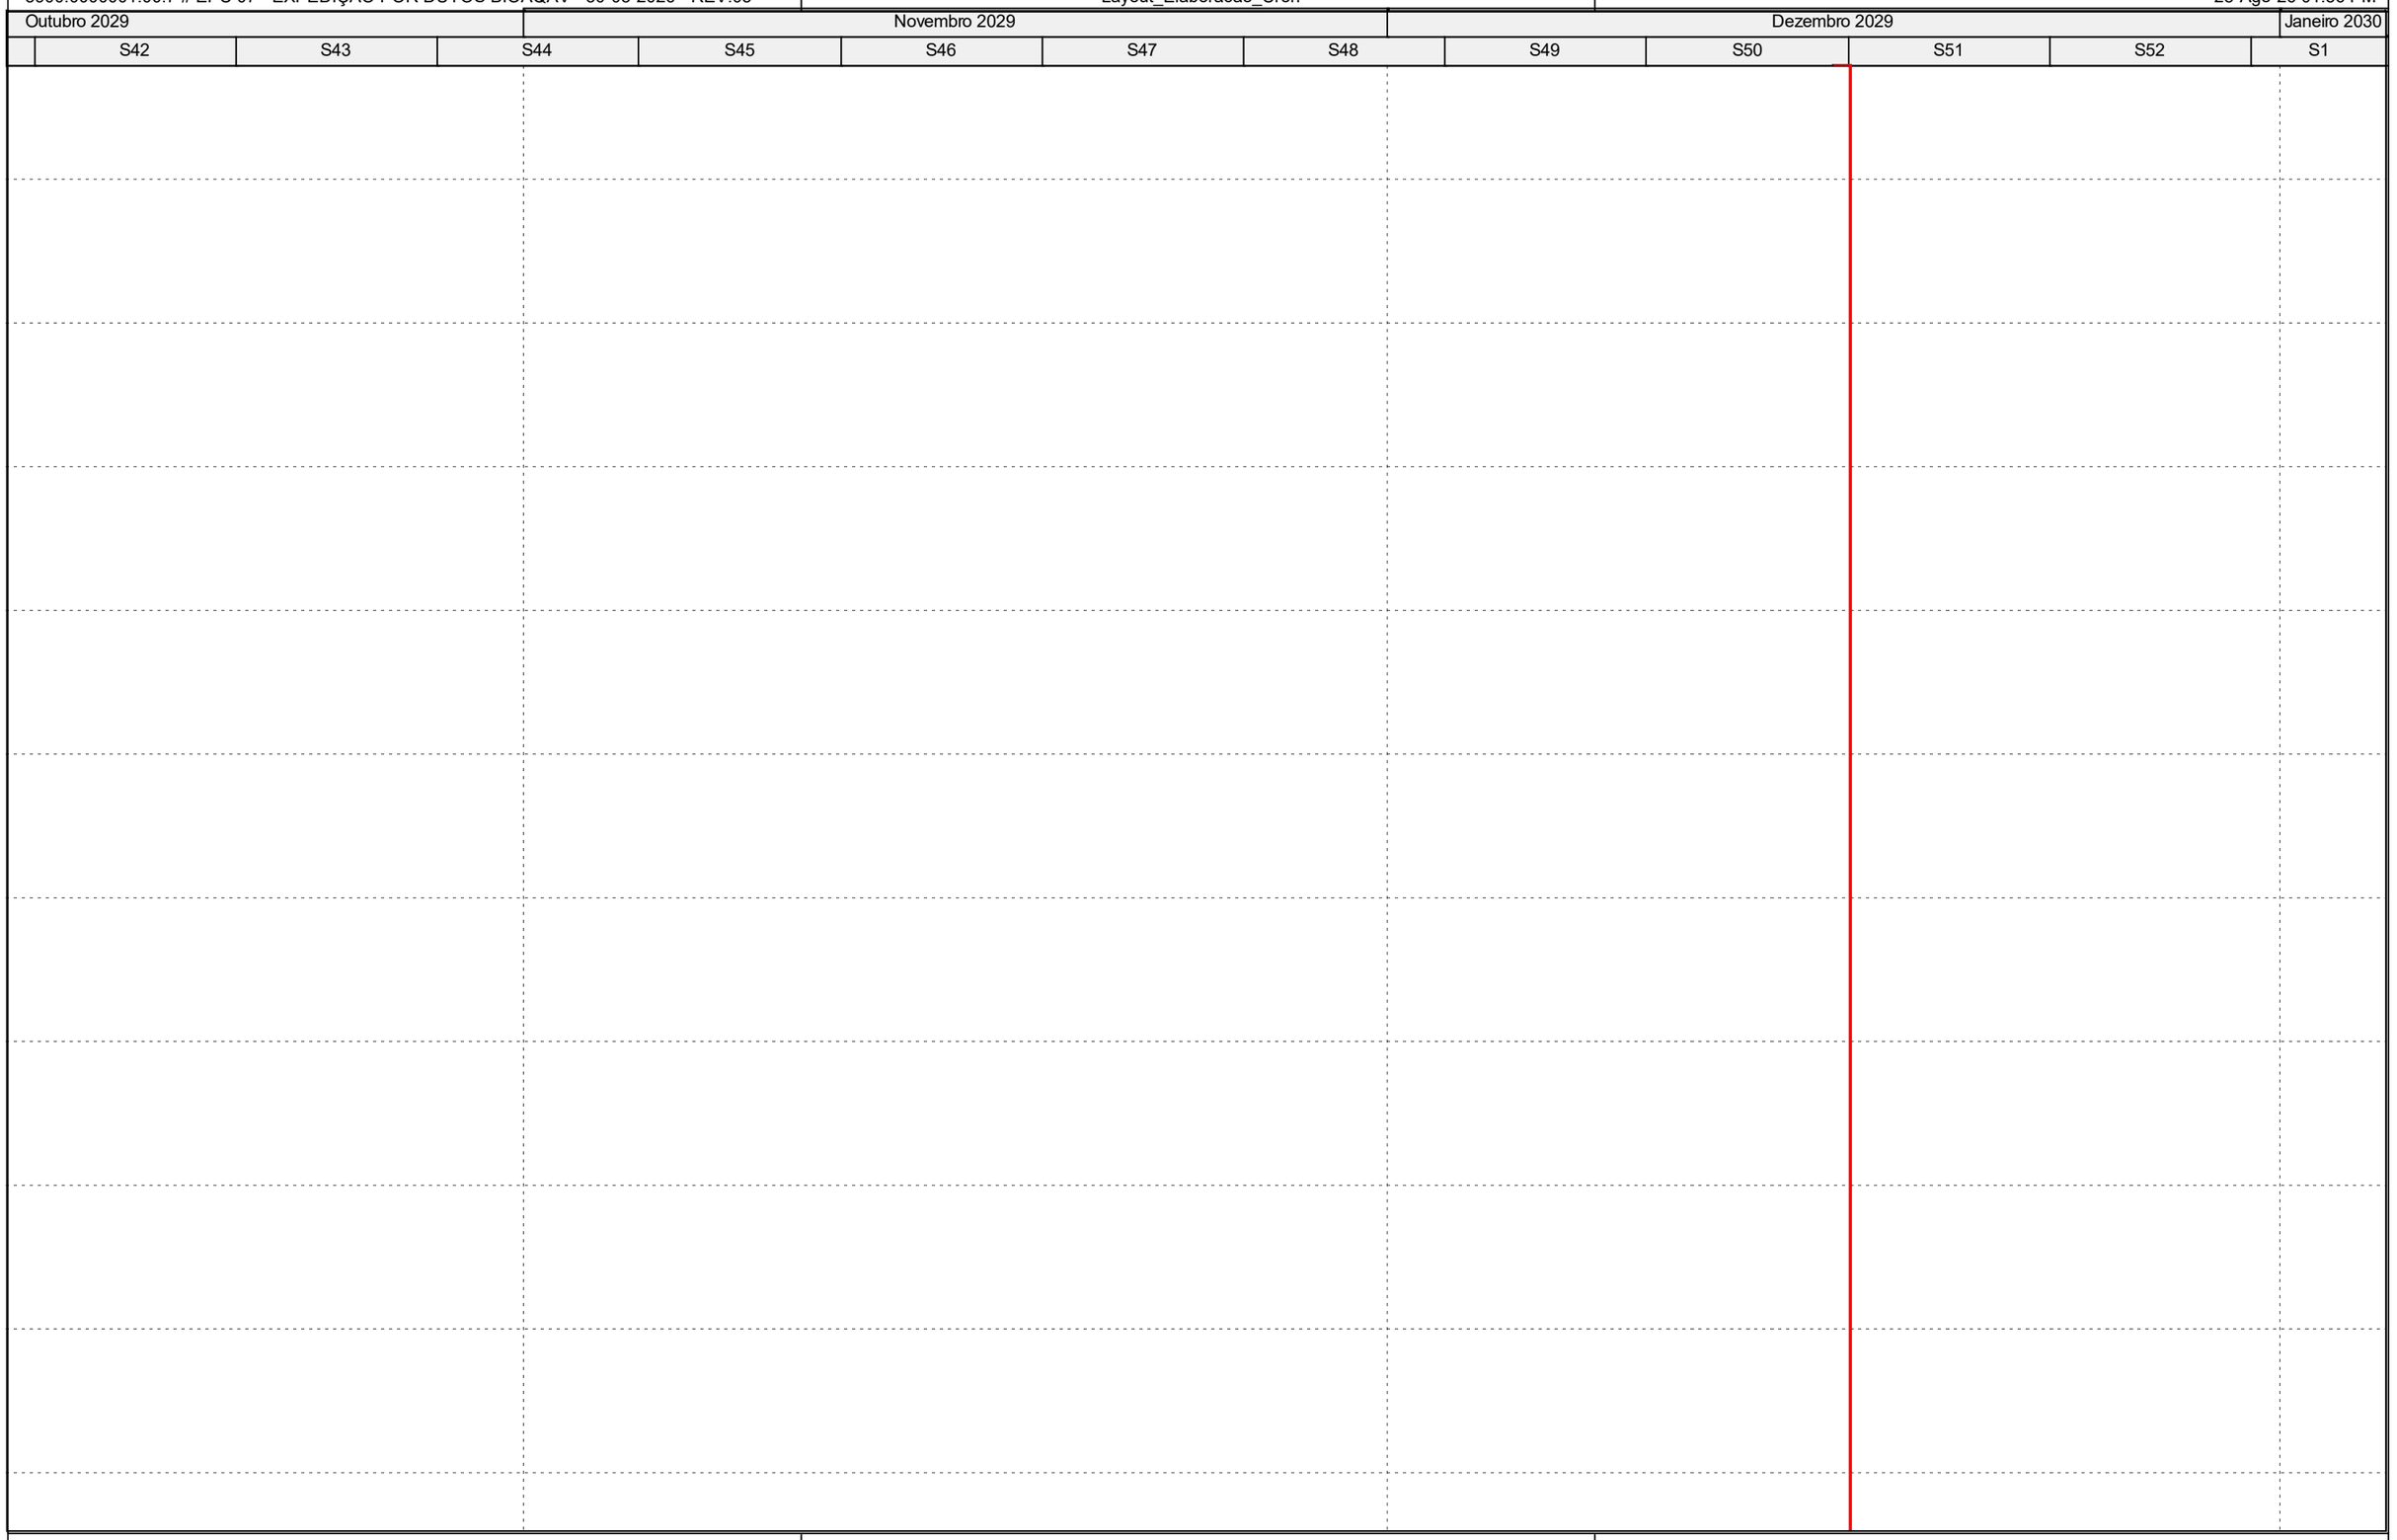

© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário
153	A	Instalação eletrodutos e calhas P-12 A INSTR	5,0d	16-Mar-28 08:00 AM	21-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
154	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.3.4	**Montagem Cabos**	22,0d	21-Mar-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
155	A	Lançamento de cabos P-12 A INSTR	22,0d	21-Mar-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
156	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.3.3	**Montagem Instrumentos**	4,0d	13-Ago-28 08:00 AM	17-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
157	A	Instalação de instrumentos P-12 A	4,0d	13-Ago-28 08:00 AM	17-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
158	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.3.2	**Válvulas instrumentadas**	4,0d	12-Abr-28 08:00 AM	16-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
159	A	Instalação de válvulas motorizadas P-12 A	4,0d	12-Abr-28 08:00 AM	16-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
160	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.5	**Elétrica**	157,0d	02-Dez-27 08:00 AM	07-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
161	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.5.5	**Montagem Aterramento**	3,0d	02-Dez-27 08:00 AM	05-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
162	A	Montagem Aterramento P-12 A	3,0d	02-Dez-27 08:00 AM	05-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
163	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.5.4	**Montagem Eletrodutos**	40,0d	16-Mar-28 08:00 AM	25-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
164	A	Montagem de Eletrodutos P-12 A	40,0d	16-Mar-28 08:00 AM	25-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
165	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.5.2	**Montagem Cabos**	10,0d	25-Abr-28 08:00 AM	05-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
166	A	Montagem de Cabos P-12 A	10,0d	25-Abr-28 08:00 AM	05-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
167	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.5.6	**Montagem Seladora**	2,0d	05-Maio-28 08:00 AM	07-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
168	A	Montagem seladora Motor Agitador P-12 A	2,0d	05-Maio-28 08:00 AM	07-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
169	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.4	**Segurança**	14,0d	17-Ago-28 08:00 AM	31-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
170	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.3.4.1	**Sistemas de combate a fogo e incêndio**	14,0d	17-Ago-28 08:00 AM	31-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
171	A	Instalação de equipamentos do sistema de espuma-Tanque P-12 A	14,0d	17-Ago-28 08:00 AM	31-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
172	A	Instalação de equipamentos do sistema de água-Tanque P-12 A	4,0d	17-Ago-28 08:00 AM	21-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
173	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4	**TANQUE P-12 B**	500,0d	02-Dez-27 08:00 AM	15-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
174	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.1	**Equipamentos Mecânicos**	155,0d	11-Nov-28 08:00 AM	15-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
175	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.1.2	**Mecânica Estáticos**	155,0d	11-Nov-28 08:00 AM	15-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
176	A	Liberação do sistema Tanque B	5,0d	11-Nov-28 08:00 AM	16-Nov-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
177	A	Drenagem do Tanque P-12 B	45,0d	16-Nov-28 08:00 AM	31-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
178	A	Limpeza interna Tanque P-12 B	15,0d	31-Dez-28 08:00 AM	15-Jan-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
179	A	Adequação + instalação do agitador Tanque P-12 B	87,0d	15-Jan-29 08:00 AM	12-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
180	A	Testes e ensaios Tanque P-12 B	3,0d	12-Abr-29 08:00 AM	15-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
181	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.2	**Tubulação**	82,0d	14-Jun-28 08:00 AM	04-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
182	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.2.1	**Fabricação Tubulação**	27,0d	14-Jun-28 08:00 AM	11-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
183	A	Fabricação Tubulação - P-12 B	15,0d	14-Jun-28 08:00 AM	29-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
184	A	Fabricação Suportes Tubulação P-12 B	7,0d	14-Jun-28 08:00 AM	21-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
185	A	Testes Tubulação P-12 B	7,0d	29-Jun-28 08:00 AM	06-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
186	A	Pintura Tubulação P-12 B	5,0d	06-Jul-28 08:00 AM	11-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
187	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.2.2	**Instalação Campo**	55,0d	11-Jul-28 08:00 AM	04-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
188	A	Instalação suportes tubulação P-12 A / B	5,0d	11-Jul-28 08:00 AM	16-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
189	A	MONTAGEM TUBULAÇÃO SELO DE NAFTA - P-12 A / B -	50,0d	16-Jul-28 08:00 AM	04-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
190	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.3	**Instrumentação**	116,0d	16-Mar-28 08:00 AM	10-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
191	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.3.1	**Infraestrutura instrumentação**	90,0d	16-Mar-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
192	A	Instalação eletrodutos e calhas P-12 B INSTR	90,0d	16-Mar-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
193	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.3.4	**Montagem Cabos**	22,0d	14-Jun-28 08:00 AM	06-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
194	A	Lançamento de cabos P-12 B INSTR	22,0d	14-Jun-28 08:00 AM	06-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
195	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.3.3	**Montagem Instrumentos**	4,0d	06-Jul-28 08:00 AM	10-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
196	A	Instalação de instrumentos P-12 B INSTR	4,0d	06-Jul-28 08:00 AM	10-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
197	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.3.2	**Válvulas instrumentadas**	4,0d	06-Jul-28 08:00 AM	10-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
198	A	Instalação de válvulas motorizadas P-12 B	4,0d	06-Jul-28 08:00 AM	10-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
199	A	Instalação de válvula Quebra-Vácuo e P-12 B	4,0d	06-Jul-28 08:00 AM	10-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
200	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.5	**Elétrica**	157,0d	02-Dez-27 08:00 AM	07-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
201	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.5.5	**Montagem Aterramento**	3,0d	02-Dez-27 08:00 AM	05-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
202	A	Montagem Aterramento P-12 B	3,0d	02-Dez-27 08:00 AM	05-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
203	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.5.4	**Montagem Eletrodutos**	40,0d	16-Mar-28 08:00 AM	25-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D

Outubro 2029: S40 | S41

Trabalho Real — Trabalho Restante — Trabalho Restante Crítico — Marco — Resumo

TASK filter: Todas as Atividades

© Oracle Corporation

Outubro 2029			Novembro 2029					Dezembro 2029					Janeiro 2030
S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1



© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário
204	A	Montagem de Eletrodutos P-12 B	40,0d	16-Mar-28 08:00 AM	25-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
205	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.5.2	**Montagem Cabos**	10,0d	25-Abr-28 08:00 AM	05-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
206	A	Montagem de Cabos P-12 B	10,0d	25-Abr-28 08:00 AM	05-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
207	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.5.6	**Montagem Seladora**	2,0d	05-Maio-28 08:00 AM	07-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
208	A	Montagem seladora Motor Agitador P-12 B	2,0d	05-Maio-28 08:00 AM	07-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
209	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.4	**Segurança**	14,0d	10-Jul-28 08:00 AM	24-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
210	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.4.4.1	**Sistemas de combate a fogo e incêndio**	14,0d	10-Jul-28 08:00 AM	24-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
211	A	Instalação de equipamentos do sistema de espuma-Tanque P-12 B	14,0d	10-Jul-28 08:00 AM	24-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
212	A	Instalação de equipamentos do sistema de água-Tanque P-12 B	4,0d	10-Jul-28 08:00 AM	14-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
213	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10	**TANQUE P-2008 A**	436,0d	08-Mar-28 08:00 AM	18-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
214	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.1	**Equipamentos Mecânicos**	368,0d	15-Maio-28 08:00 AM	18-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
215	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.1.1	**Mecânica dinâmicos**	3,0d	15-Maio-29 08:00 AM	18-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
216	A	Instalação do Agitador Tanque P-2008 A	3,0d	15-Maio-29 08:00 AM	18-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
217	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.1.2	**Mecânica Estáticos**	365,0d	15-Maio-28 08:00 AM	15-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
218	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.1.2.1	**Fabricação - Tanque A**	50,0d	15-Maio-28 08:00 AM	04-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
219		Fabricar Chapas Fundo Tanque A	30,0d	15-Maio-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
220		Fabricar Chapas Costado Tanque A	50,0d	15-Maio-28 08:00 AM	04-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
221		Fabricar Chapas Teto Flutuante Tanque A	30,0d	15-Maio-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
222		Fabricar Acessórios Tanque A	10,0d	15-Maio-28 08:00 AM	25-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
223	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.1.2.2	**Instalação Campo**	300,0d	19-Jul-28 08:00 AM	15-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
224		Montagem Fundo Tanque P-2008 A	25,0d	19-Jul-28 08:00 AM	13-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
225		Montagem Costado Tanque P-2008 A	120,0d	13-Ago-28 08:00 AM	11-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
226		Montagem do Teto Flutuante P-2008 A	100,0d	11-Dez-28 08:00 AM	21-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
227		Montagem Sistema de Drenagem e Selo do Teto P-2008 A	20,0d	11-Dez-28 08:00 AM	31-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
228		Montagem Domo Tanque A	15,0d	21-Mar-29 08:00 AM	05-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
229		Testes e Estanqueidade e flutuabilidade P-2008 A	10,0d	05-Abr-29 08:00 AM	15-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
230		Pintura P-2008 A	20,0d	15-Abr-29 08:00 AM	05-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
231		Limpeza e inspeção final P-2008 A	10,0d	05-Maio-29 08:00 AM	15-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
232	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.2	**Tubulação**	175,0d	14-Jun-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
233	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.2.1	**Fabricação Tubulação**	55,0d	14-Jun-28 08:00 AM	08-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
234	A	Fabricação Tubulação Tanque P-2008 A	15,0d	14-Jun-28 08:00 AM	29-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
235	A	Fabricar Suportação das Tubulações do Tanque P-2008 A	10,0d	14-Jun-28 08:00 AM	24-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
236	A	Testes Tubulação Tanque P-2008 A	25,0d	29-Jun-28 08:00 AM	24-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
237	A	Pintura Tubulação Tanque P-2008 A	15,0d	24-Jul-28 08:00 AM	08-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
238	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.2.2	**Instalação Campo**	120,0d	08-Ago-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
239	A	Instalar suportação das tubulações no campo p/ Tanque P-2008-A	20,0d	08-Ago-28 08:00 AM	28-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
240	A	MONTAGEM TUBULAÇÃO TANQUES P-2008 A	100,0d	28-Ago-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
241	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.3	**Instrumentação**	96,0d	16-Mar-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
242	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.3.1	**Infraestrutura instrumentação**	45,0d	16-Mar-28 08:00 AM	30-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
243	A	Instalação eletrodutos e calhas Instr P-2008 A	45,0d	16-Mar-28 08:00 AM	30-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
244	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.3.4	**Montagem Cabos**	11,0d	30-Abr-28 08:00 AM	11-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
245	A	Lançamento de cabos P-2008 A	11,0d	30-Abr-28 08:00 AM	11-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
246	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.3.3	**Montagem Instrumentos**	6,0d	14-Jun-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
247	A	Instalação de instrumentos P-2008 A	6,0d	14-Jun-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
248	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.3.2	**Válvulas instrumentadas**	3,0d	11-Maio-28 08:00 AM	14-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
249	A	Instalação de válvulas motorizadas P-2008 A	3,0d	11-Maio-28 08:00 AM	14-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
250	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.5	**Elétrica**	35,0d	08-Mar-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
251	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.5.5	**Montagem Aterramento**	7,0d	08-Mar-28 08:00 AM	15-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
252	A	Montagem Aterramento	7,0d	08-Mar-28 08:00 AM	15-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
253	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.5.4	**Montagem Eletrodutos**	15,0d	16-Mar-28 08:00 AM	31-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
254	A	Montagem de Eletrodutos	15,0d	16-Mar-28 08:00 AM	31-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D

Outubro 2029: S40 | S41

Trabalho Real · Trabalho Restante · Trabalho Restante Crítico · Marco · Resumo

TASK filter: Todas as Atividades

© Oracle Corporation

Outubro 2029			Novembro 2029					Dezembro 2029					Janeiro 2030
S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1



© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário
255		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.5.2 Montagem Cabos**	10,0d	31-Mar-28 08:00 AM	10-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
256	A	Montagem de Cabos	10,0d	31-Mar-28 08:00 AM	10-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
257		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.5.6 Montagem Seladora**	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
258	A	Montagem seladora Motor Agitador	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
259		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.6 Segurança**	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
260		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.10.6.1 Sistemas de combate a fogo e incêndio**	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
261	A	Instalação de equipamentos do sistema de espuma-Tanque P-2008 A	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
262	A	Instalação de equipamentos do sistema de água-Tanque P-2008 A	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
263		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1 TANQUE P-2008 B**	515,0d	17-Dez-27 08:00 AM	15-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
264		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.1 Equipamentos Mecânicos**	365,0d	15-Maio-28 08:00 AM	15-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
265		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.1.1 Mecânica dinâmicos**	5,0d	10-Maio-29 08:00 AM	15-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
266	A	Instalação do Agitador Tanque P-2008 B	5,0d	10-Maio-29 08:00 AM	15-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
267		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.1.2 Mecânica Estáticos**	360,0d	15-Maio-28 08:00 AM	10-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
268		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.1.2.1 Fabricação - Tanque B**	50,0d	15-Maio-28 08:00 AM	04-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
269		Fabricar Chapas Fundo Tanque B	30,0d	15-Maio-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
270		Fabricar Chapas Costado Tanque B	50,0d	15-Maio-28 08:00 AM	04-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
271		Fabricar Chapas Teto Flutuante Tanque B	30,0d	15-Maio-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
272		Fabricar Acessórios Tanque B	10,0d	15-Maio-28 08:00 AM	25-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
273		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.1.2.2 Instalação Campo**	300,0d	14-Jul-28 08:00 AM	10-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
274		Montagem Fundo Tanque P-2008 B	25,0d	14-Jul-28 08:00 AM	08-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
275		Montagem Costado Tanque P-2008 B	120,0d	08-Ago-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
276		Montagem do Teto Flutuante P-2008 B	100,0d	06-Dez-28 08:00 AM	16-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
277		Montagem Sistema de Drenagem e Selo do Teto P-2008B	20,0d	06-Dez-28 08:00 AM	26-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
278		Montagem Domo Tanque B	15,0d	16-Mar-29 08:00 AM	31-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
279		Testes e Estanqueidade e flutuabilidade P-2008 B	10,0d	31-Mar-29 08:00 AM	10-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
280		Pintura P-2008 B	20,0d	10-Abr-29 08:00 AM	30-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
281		Limpeza e inspeção final P-2008 B	10,0d	30-Abr-29 08:00 AM	10-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
282		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.2 Tubulação**	175,0d	14-Jun-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
283		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.2.1 Fabricação Tubulação**	55,0d	14-Jun-28 08:00 AM	08-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
284	A	Fabricação Tubulação Tanque P-2008 B	15,0d	14-Jun-28 08:00 AM	29-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
285	A	Fabricar suportação das Tubulações do Tanque P-2008 B	10,0d	14-Jun-28 08:00 AM	24-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
286	A	Testes Tubulação Tanque P-2008 B	25,0d	29-Jun-28 08:00 AM	24-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
287	A	Pintura tubulação Tanque P-2008 B	15,0d	24-Jul-28 08:00 AM	08-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
288		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.2.2 Instalação Campo**	120,0d	08-Ago-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
289	A	Instalar suportação das tubulações no campo p/ Tanque P-2008 B	20,0d	08-Ago-28 08:00 AM	28-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
290	A	MONTAGEM TUBULAÇÃO TANQUES P-2008 B	100,0d	28-Ago-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
291		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.3 Instrumentação**	96,0d	16-Mar-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
292		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.3.1 Infraestrutura instrumentação**	45,0d	16-Mar-28 08:00 AM	30-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
293	A	Instalação eletrodutos e calhas Instr P-2008 B	45,0d	16-Mar-28 08:00 AM	30-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
294		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.3.4 Montagem Cabos**	11,0d	30-Abr-28 08:00 AM	11-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
295	A	Montagem de cabos Instr P-2008 B	11,0d	30-Abr-28 08:00 AM	11-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
296		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.3.3 Montagem Instrumentos**	6,0d	14-Jun-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
297	A	Instalação de instrumentos P-2008 B	6,0d	14-Jun-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
298		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.3.2 Válvulas instrumentadas**	3,0d	11-Maio-28 08:00 AM	14-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
299	A	Instalação de válvulas motorizadas P-2008 B	3,0d	11-Maio-28 08:00 AM	14-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
300		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.5 Elétrica**	117,0d	17-Dez-27 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
301		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.5.5 Montagem Aterramento**	7,0d	17-Dez-27 08:00 AM	24-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
302	A	Montagem Aterramento	7,0d	17-Dez-27 08:00 AM	24-Dez-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
303		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.5.4 Montagem Eletrodutos**	15,0d	16-Mar-28 08:00 AM	31-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
304	A	Montagem de Eletrodutos	15,0d	16-Mar-28 08:00 AM	31-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
305		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.5.2 Montagem Cabos**	10,0d	31-Mar-28 08:00 AM	10-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D

Outubro 2029: S40 | S41

© Oracle Corporation

Outubro 2029			Novembro 2029					Dezembro 2029					Janeiro 2030
S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1



© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário
306	A	Montagem de Cabos	10,0d	31-Mar-28 08:00 AM	10-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
307	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.5.6	**Montagem Seladora**	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
308	A	Montagem seladora Motor Agitador	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
309	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.4	**Segurança**	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
310	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.1.4.1	**Sistemas de combate a fogo e incêndio**	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
311	A	Instalação de equipamentos do sistema de espuma-Tanque P-2008 B	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
312	A	Instalação de equipamentos do sistema de água-Tanque P-2008 B	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
313	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2	**TANQUE P-2008 C**	433,0d	03-Mar-28 08:00 AM	10-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
314	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.1	**Equipamentos Mecânicos**	360,0d	15-Maio-28 08:00 AM	10-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
315	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.1.1	**Mecânica dinâmicos**	5,0d	05-Maio-29 08:00 AM	10-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
316	A	Instalação do Agitador Tanque P-2008 C	5,0d	05-Maio-29 08:00 AM	10-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
317	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.1.2	**Mecânica Estáticos**	355,0d	15-Maio-28 08:00 AM	05-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
318	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.1.2.1	**Fabricação - Tanque C**	50,0d	15-Maio-28 08:00 AM	04-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
319		Fabricar Chapas Fundo Tanque C	30,0d	15-Maio-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
320		Fabricar Chapas Costado Tanque C	50,0d	15-Maio-28 08:00 AM	04-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
321		Fabricar Chapas Teto Flutuante Tanque C	30,0d	15-Maio-28 08:00 AM	14-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
322		Fabricar Acessórios Tanque C	10,0d	15-Maio-28 08:00 AM	25-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
323	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.1.2.2	**Instalação Campo**	300,0d	09-Jul-28 08:00 AM	05-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
324		Montagem Fundo Tanque P-2008 C	25,0d	09-Jul-28 08:00 AM	03-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
325		Montagem Costado Tanque P-2008 C	120,0d	03-Ago-28 08:00 AM	01-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
326		Montagem do Teto Flutuante P-2008 C	100,0d	01-Dez-28 08:00 AM	11-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
327		Montagem Sistema de Drenagem e Selo do Teto P-2008 C	20,0d	01-Dez-28 08:00 AM	21-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
328		Montagem Domo Tanque C	15,0d	11-Mar-29 08:00 AM	26-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
329		Testes e Estanqueidade e flutuabilidade P-2008 C	10,0d	26-Mar-29 08:00 AM	05-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
330		Pintura P-2008 C	20,0d	05-Abr-29 08:00 AM	25-Abr-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
331		Limpeza e inspeção final P-2008 C	10,0d	25-Abr-29 08:00 AM	05-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
332	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.2	**Tubulação**	175,0d	14-Jun-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
333	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.2.1	**Fabricação Tubulação**	55,0d	14-Jun-28 08:00 AM	08-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
334	A	Fabricação Tubulação Tanque P-2008 C	15,0d	14-Jun-28 08:00 AM	29-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
335	A	Fabricar suportação das Tubulações do Tanque P-2008 C	10,0d	14-Jun-28 08:00 AM	24-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
336	A	Testes Tubulação Tanque P-2008 C	25,0d	29-Jun-28 08:00 AM	24-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
337	A	Pintura Tubulação Tanque P-2008 C	15,0d	24-Jul-28 08:00 AM	08-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
338	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.2.2	**Instalação Campo**	120,0d	08-Ago-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
339	A	Instalar suportação das tubulações no campo p/ Tanque P-2008 C	20,0d	08-Ago-28 08:00 AM	28-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
340	A	MONTAGEM TUBULAÇÃO TANQUES P-2008 C	100,0d	28-Ago-28 08:00 AM	06-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
341	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.3	**Instrumentação**	96,0d	16-Mar-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
342	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.3.1	**Infraestrutura instrumentação**	45,0d	16-Mar-28 08:00 AM	30-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
343	A	Instalação eletrodutos e calhas Instr Tanque P-2008 C	45,0d	16-Mar-28 08:00 AM	30-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
344	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.3.4	**Montagem Cabos**	11,0d	30-Abr-28 08:00 AM	11-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
345	A	Lançamento de cabos Instr Tanque P-2008 C	11,0d	30-Abr-28 08:00 AM	11-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
346	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.3.3	**Montagem de instrumentos**	6,0d	14-Jun-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
347	A	Instalação de instrumentos P-2008 C	6,0d	14-Jun-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
348	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.3.2	**Válvulas instrumentadas**	3,0d	11-Maio-28 08:00 AM	14-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
349	A	Instalação de válvulas motorizadas P-2008 C	3,0d	11-Maio-28 08:00 AM	14-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
350	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.5	**Elétrica**	40,0d	03-Mar-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
351	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.5.5	**Montagem Aterramento**	7,0d	03-Mar-28 08:00 AM	10-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
352	A	Montagem Aterramento	7,0d	03-Mar-28 08:00 AM	10-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
353	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.5.4	**Montagem Eletrodutos**	15,0d	16-Mar-28 08:00 AM	31-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
354	A	Montagem de Eletrodutos	15,0d	16-Mar-28 08:00 AM	31-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
355	RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.5.2	**Montagem Cabos**	10,0d	31-Mar-28 08:00 AM	10-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D

Outubro 2029: S40 | S41

© Oracle Corporation

Outubro 2029			Novembro 2029					Dezembro 2029					Janeiro 2030
S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1

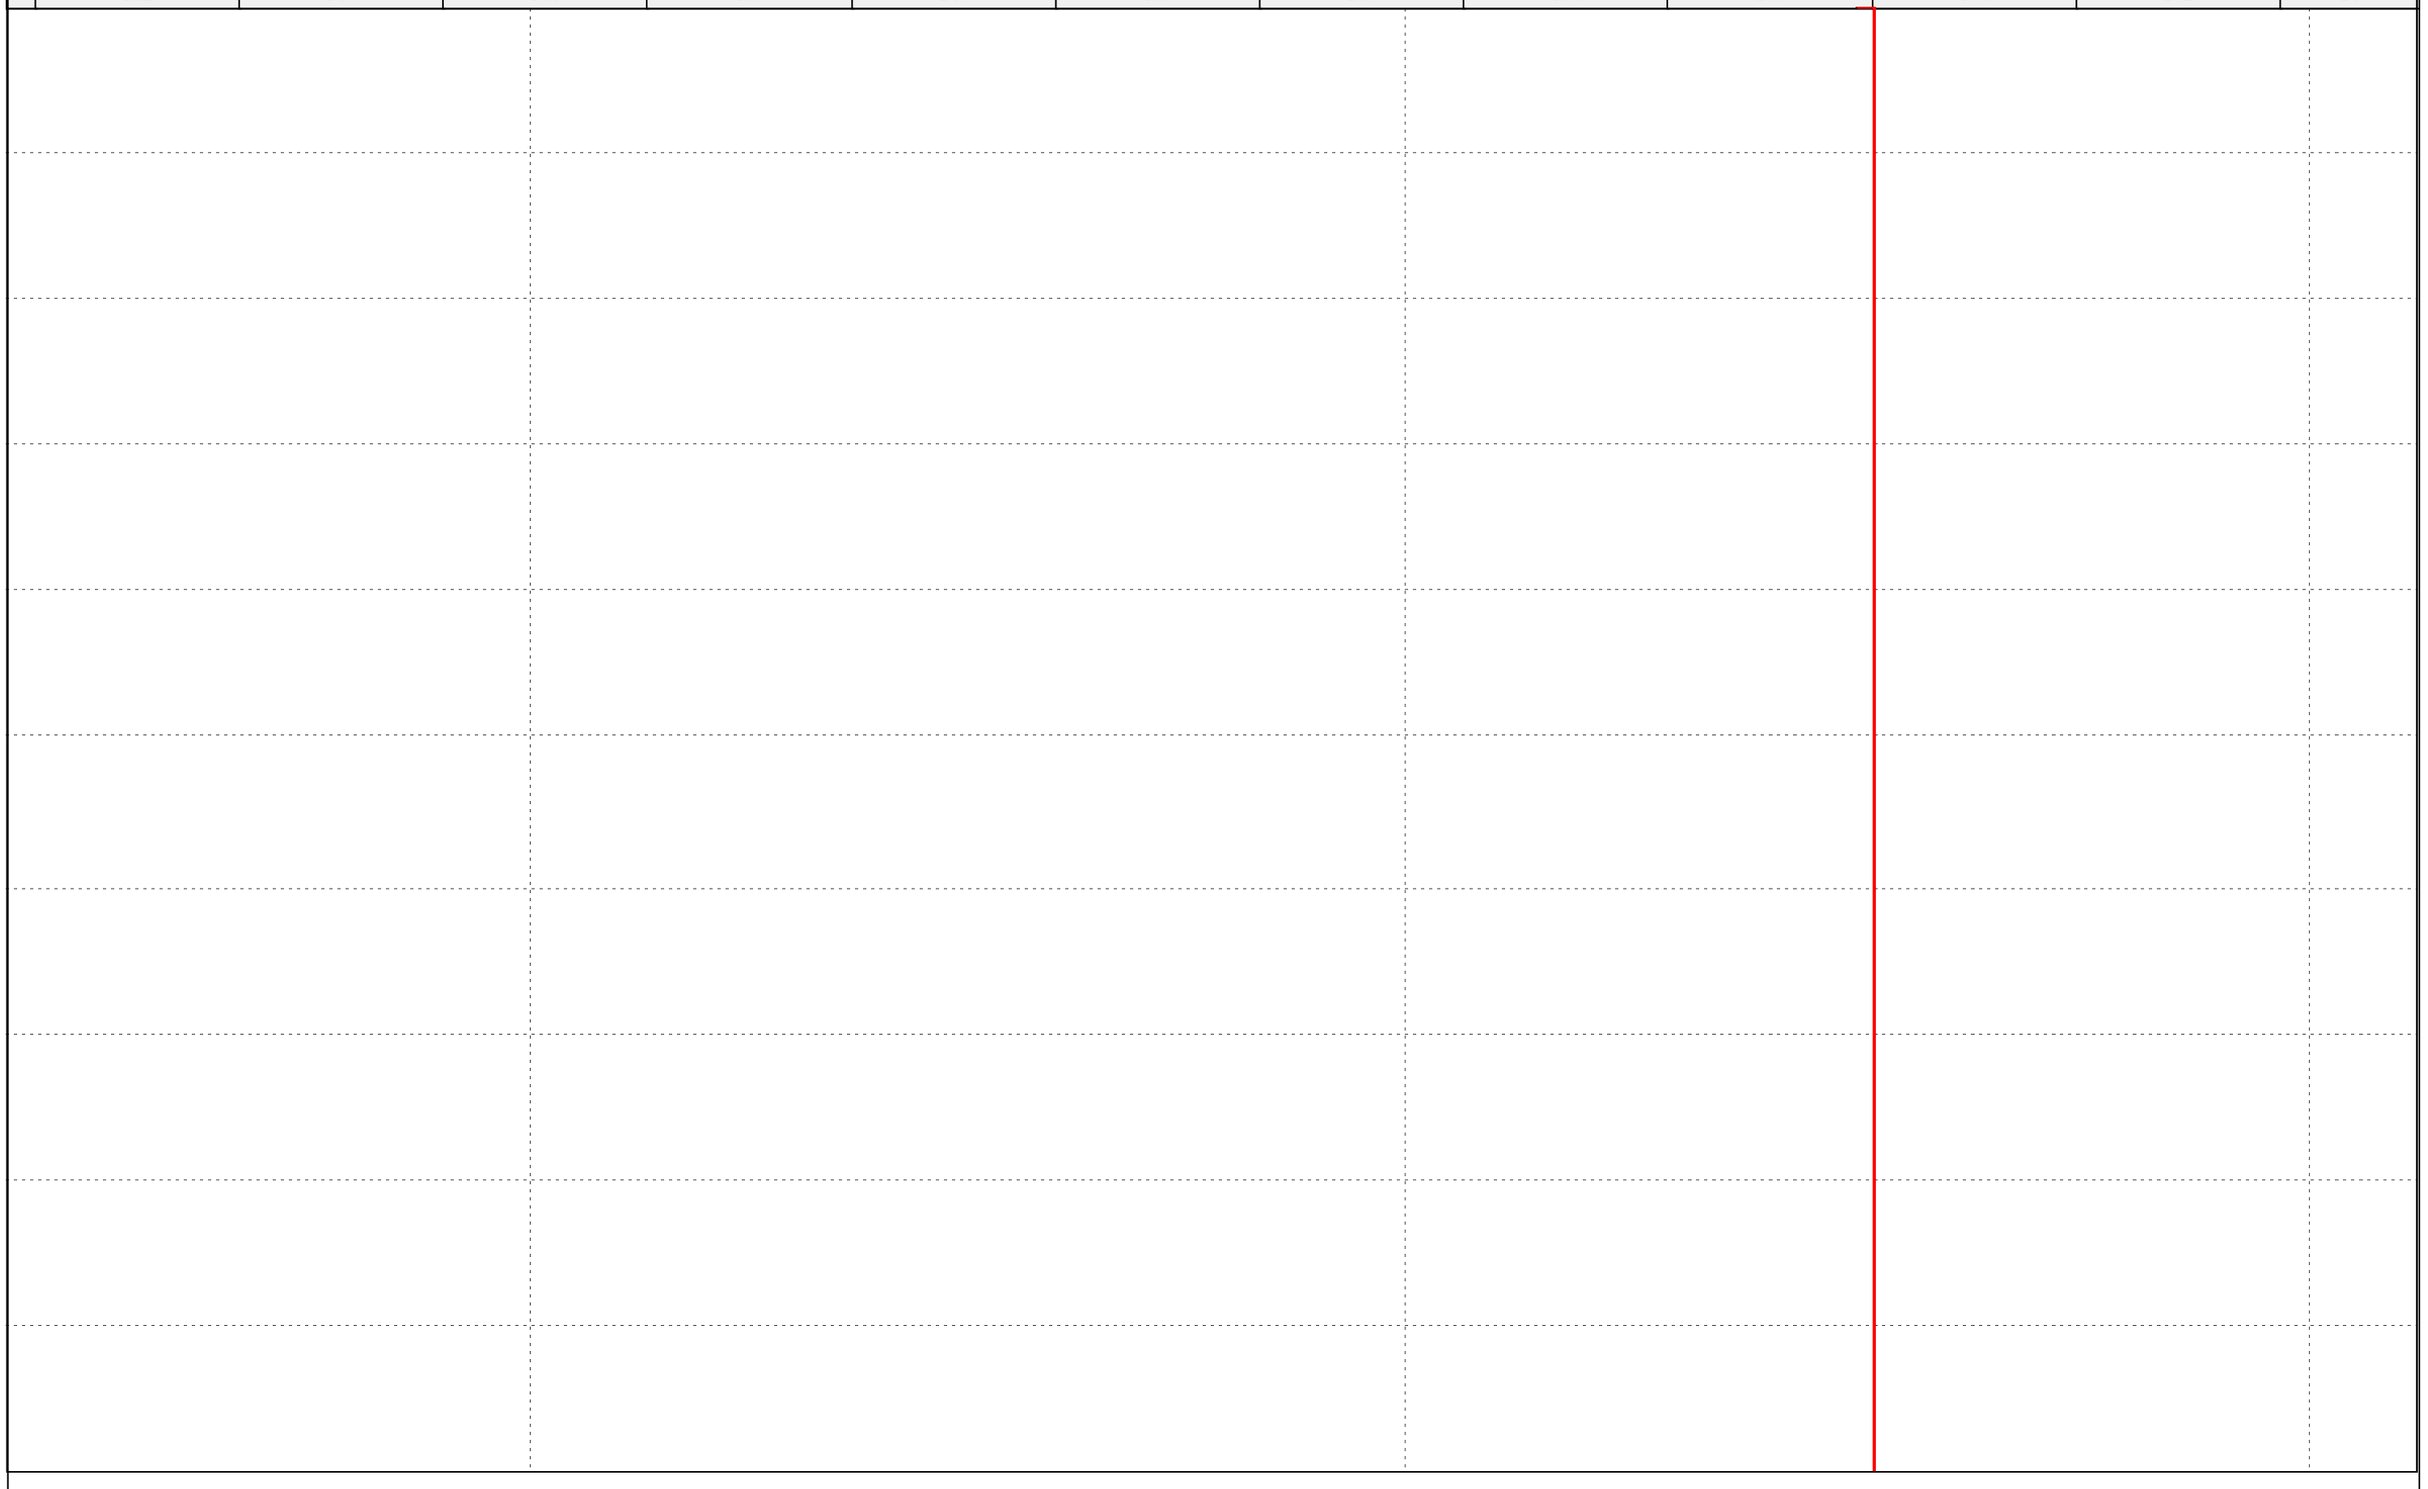

© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário
356	A	Montagem de Cabos	10,0d	31-Mar-28 08:00 AM	10-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
357	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.5.6**	**Montagem Seladora**	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
358	A	Montagem seladora Motor Agitador	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
359	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.4**	**Segurança**	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
360	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.2.4.1**	**Sistemas de combate a fogo e incêndio**	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
361	A	Instalação de equipamentos do sistema de espuma-Tanque P-2008 C	5,0d	10-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
362	A	Instalação de equipamentos do sistema de água-Tanque P-2008 C	2,0d	10-Abr-28 08:00 AM	12-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
363	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5**	**AROE / ARNO / UT2**	587,0d	27-Set-27 08:00 AM	06-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
364	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.1**	**Equipamentos Mecânicos**	587,0d	27-Set-27 08:00 AM	06-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
365	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.1.1**	**Mecânica dinâmicos**	587,0d	27-Set-27 08:00 AM	06-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
366	A	Revisão de Bombas J-158 A	21,0d	27-Set-27 08:00 AM	18-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
367	A	Revisão de Bombas J-159 A	21,0d	27-Set-27 08:00 AM	18-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
368	A	Montagem da B-25124003 B - BOMBA DOSADORA DE ANTIOXIDANTE	15,0d	14-Jul-28 08:00 AM	29-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
369	A	Montagem da B-25124003 A - BOMBA DOSADORA DE ANTIOXIDANTE	15,0d	14-Jul-28 08:00 AM	29-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
370	A	Montagem da J-4522 A - BOMBA DE DIESEL	30,0d	09-Fev-29 08:00 AM	11-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
371	A	Montagem da J-4522 B - BOMBA DE DIESEL	30,0d	06-Abr-29 08:00 AM	06-Maio-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
372	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.1.2**	**Mecânica Estáticos**	5,0d	02-Out-28 08:00 AM	07-Out-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
373	A	Instalação do reservatório das bombas dosadoras de anti oxidanrte	5,0d	02-Out-28 08:00 AM	07-Out-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
374	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2**	**Tubulação**	90,0d	14-Jun-28 08:00 AM	12-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
375	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.3**	**BOMBAS J-4522 A / B**	90,0d	14-Jun-28 08:00 AM	12-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
376	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.3.1**	**Fabricação Tubulação**	30,0d	14-Jun-28 08:00 AM	14-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
377		Fabricar tubulação bombas J-4522 A / B	20,0d	14-Jun-28 08:00 AM	04-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
378		Fabricar suportação para tubulação das bombas J-4522 A / B	10,0d	14-Jun-28 08:00 AM	24-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
379		Testar tubulação bombas J-4522 A / B	3,0d	04-Jul-28 08:00 AM	07-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
380		Pintura tubulação bombas J-4522 A / B	7,0d	07-Jul-28 08:00 AM	14-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
381	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.3.2**	**Instalação Campo**	60,0d	14-Jul-28 08:00 AM	12-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
382		Montagem e interligação tubulação Saída das bombas J-4522 A / B	60,0d	14-Jul-28 08:00 AM	12-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
383	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.4**	**BOMBAS B-25124003 A / B**	18,0d	14-Jun-28 08:00 AM	02-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
384	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.4.1**	**Fabricação Tubulação**	6,0d	14-Jun-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
385		Fabricar tubulação bombas dosadoras	2,0d	14-Jun-28 08:00 AM	16-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
386		Fabricar suportação para tubulação das bombas B-25124003 A /B	3,0d	14-Jun-28 08:00 AM	17-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
387		Testar tubulação bombas dosadoras	2,0d	16-Jun-28 08:00 AM	18-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
388		Pintura tubulação bombas dosadoras	2,0d	18-Jun-28 08:00 AM	20-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
389	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.4.2**	**Instalação Campo**	15,0d	17-Jun-28 08:00 AM	02-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
390		Instalar Suportação bombas B-25124003 A/B	5,0d	17-Jun-28 08:00 AM	22-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
391		Montagem e interligação tubulação Saída das bombas dosadoras	10,0d	22-Jun-28 08:00 AM	02-Jul-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
392	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.1**	**AROE**	10,0d	14-Jun-28 08:00 AM	24-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
393	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.1.1**	**Fabricação tubulação AROE**	5,0d	14-Jun-28 08:00 AM	19-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
394		Fabricação tubulação Cavalete FV-44201	5,0d	14-Jun-28 08:00 AM	19-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
395	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.2.1.2**	**Instalação Campo**	5,0d	19-Jun-28 08:00 AM	24-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
396		MONTAGEM CAVALETE DA VÁLVULA FV-44201	5,0d	19-Jun-28 08:00 AM	24-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
397	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3**	**Instrumentação**	262,0d	16-Mar-28 08:00 AM	03-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
398	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3.2**	**BOMBAS J-4522-A / B**	262,0d	16-Mar-28 08:00 AM	03-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
399	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3.2.1**	**Infraestrutura instrumentação**	160,0d	16-Mar-28 08:00 AM	23-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
400		Instalação eletrodutos e calhas J-4522 A / B INSTR	160,0d	16-Mar-28 08:00 AM	23-Ago-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
401	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3.2.4**	**Montagem Cabos**	33,0d	23-Ago-28 08:00 AM	25-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
402		Lançamento de Cabos J-4522 A / B INSTR	33,0d	23-Ago-28 08:00 AM	25-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
403	**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3.2.2**	**Montagem Instrumentos / Válvulas / Disposit**	69,0d	25-Set-28 08:00 AM	03-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
404		Instalação de instrumentos J-4522 A / B	59,0d	25-Set-28 08:00 AM	23-Nov-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
405		INSTALAÇÃO MOTORIZADAS AROE	8,0d	25-Set-28 08:00 AM	03-Out-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
406		INSTALAÇÃO DE UNIDADES REMOTAS	3,0d	25-Set-28 08:00 AM	28-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D

Outubro 2029: S40 | S41

Trabalho Real · Trabalho Restante · Trabalho Restante Crítico · Marco · Resumo

TASK filter: Todas as Atividades

© Oracle Corporation

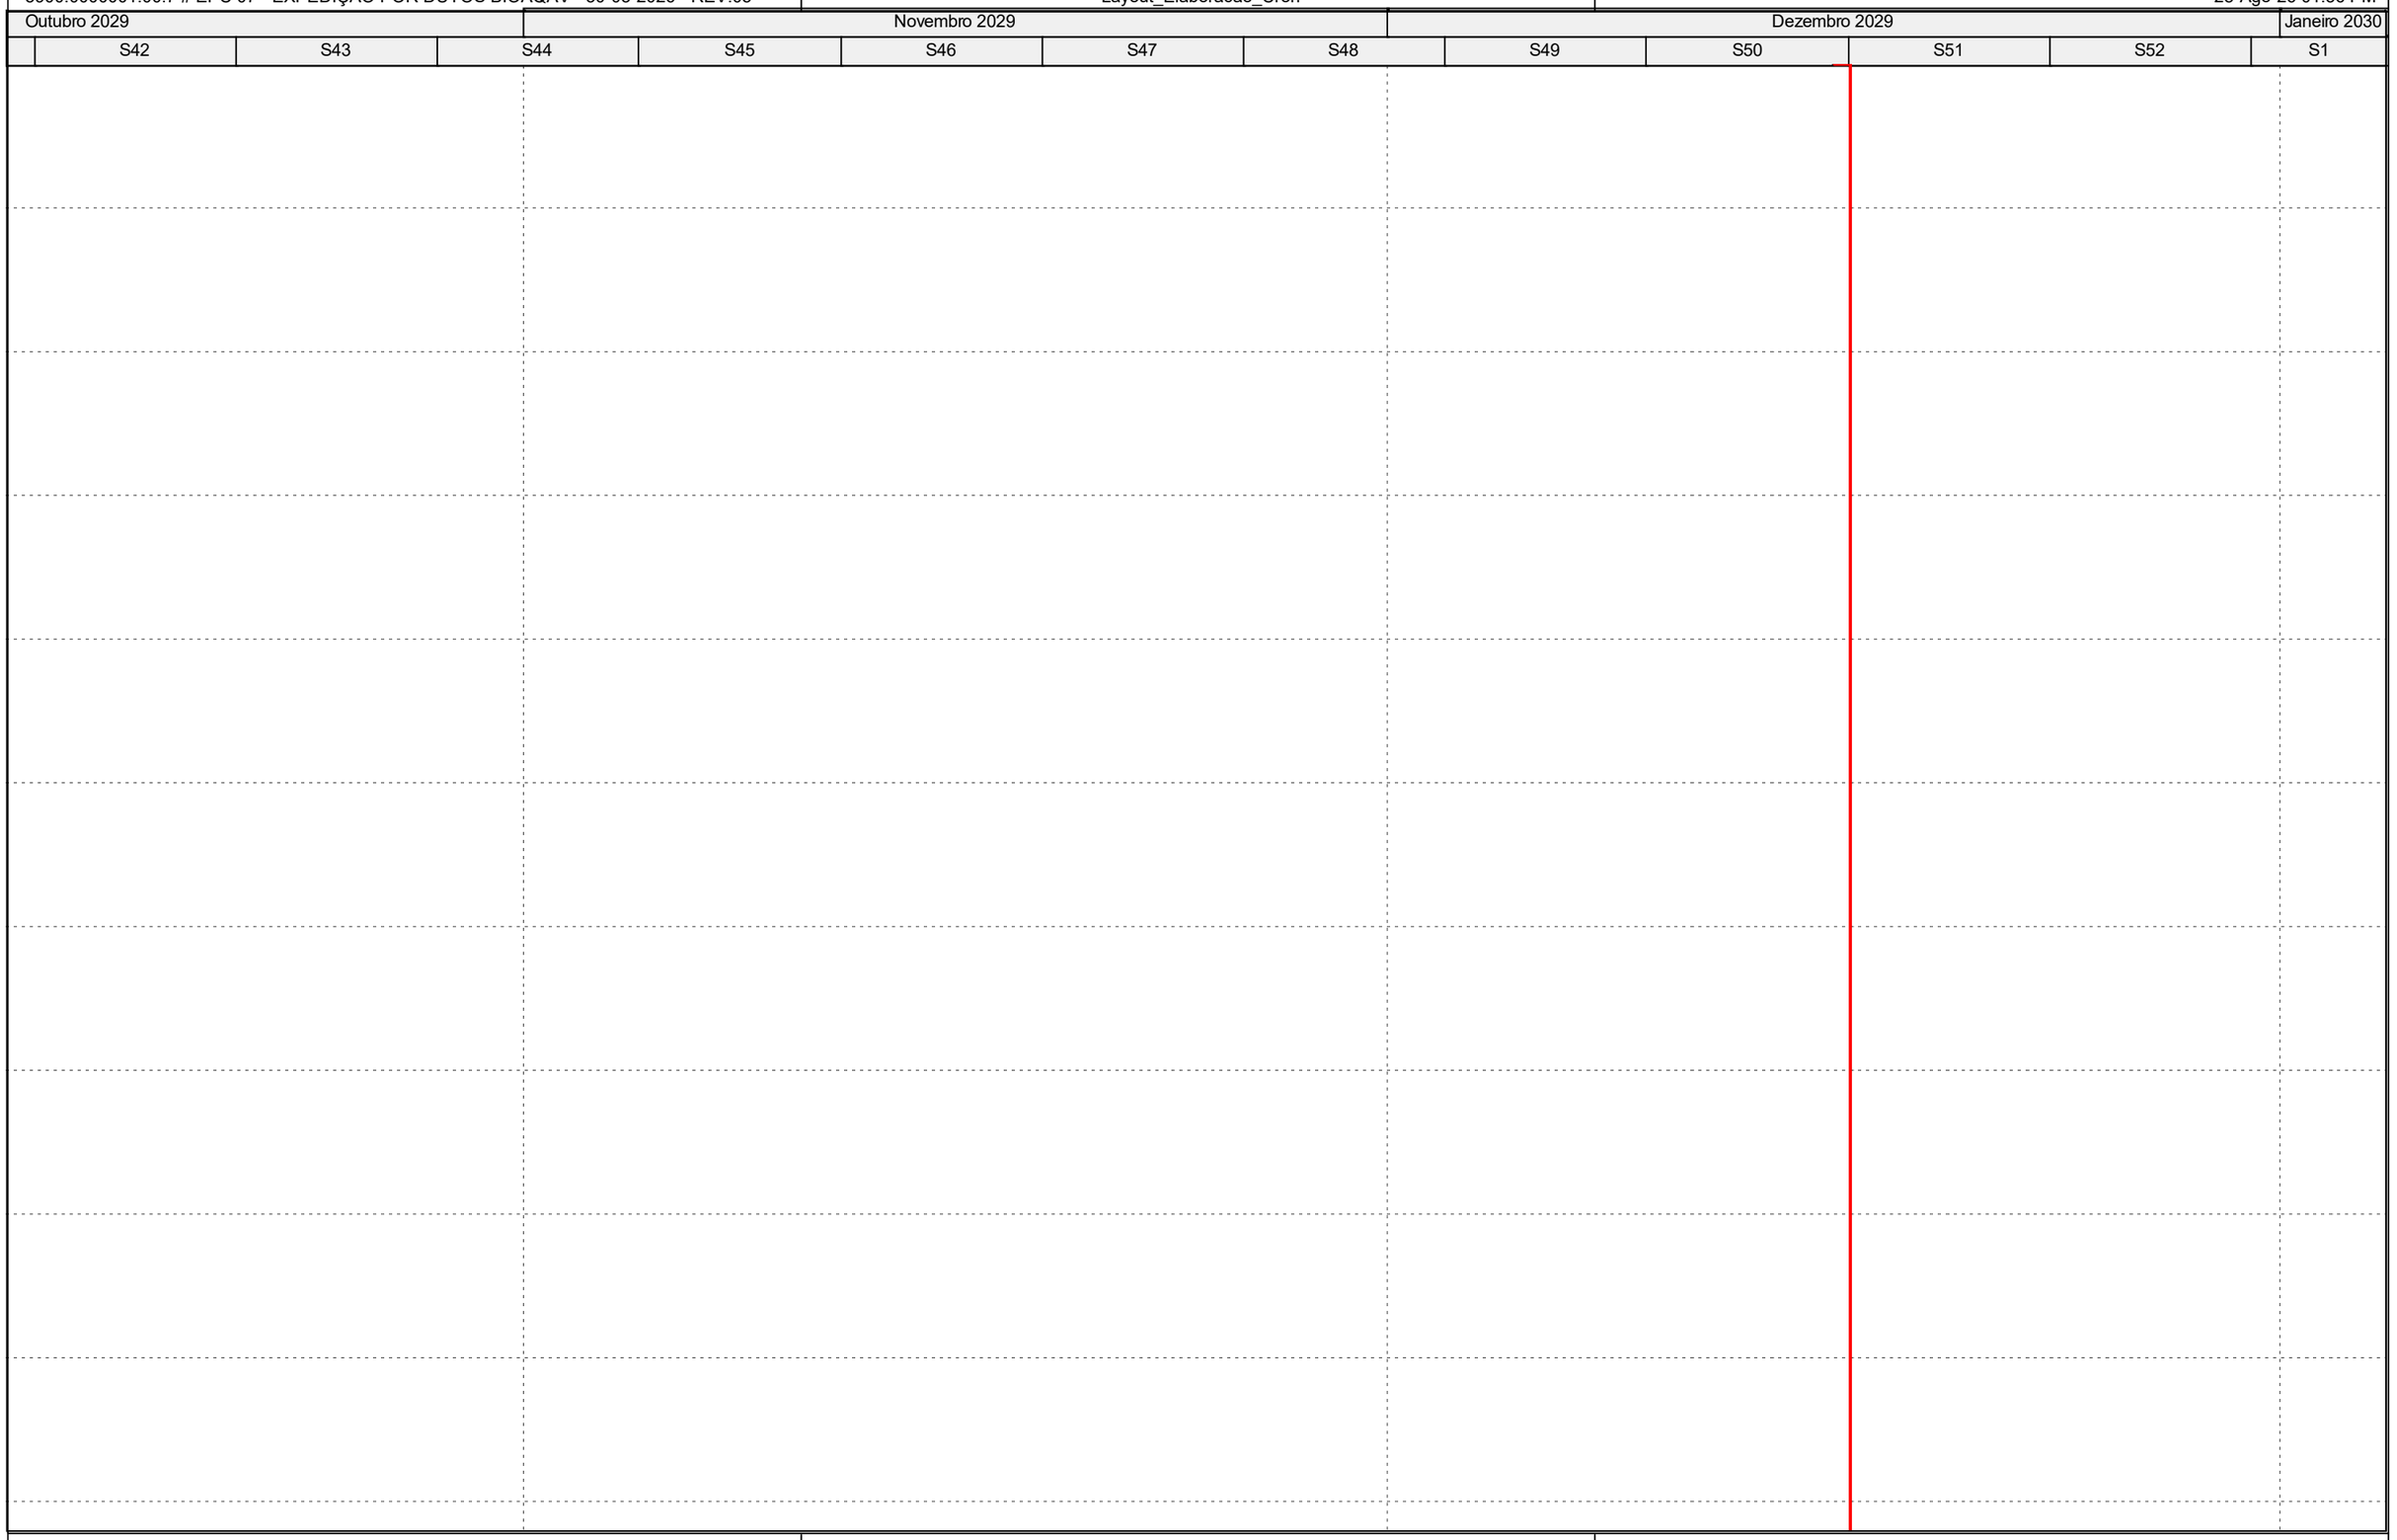

© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário	Outubro 2029	
							S40	S41
407		INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE JUNÇÃO -MMS	3,0d	25-Set-28 08:00 AM	28-Set-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
408		Efetuar testes J-4522 A / B	10,0d	23-Nov-28 08:00 AM	03-Dez-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
409		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3.3 BOMBAS B-25124003 A / B**	106,0d	16-Mar-28 08:00 AM	30-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
410		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3.3.1 Infraestrutura instrumentação**	20,0d	16-Mar-28 08:00 AM	05-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
411		Instalação eletrodutos e calhas B-25124003 A / B INSTR	20,0d	16-Mar-28 08:00 AM	05-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
412		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3.3.4 Montagem Cabos**	10,0d	05-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
413		Lançamento de Cabos B-25124003 A / B INSTR	10,0d	05-Abr-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
414		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.3.3.2 Montagem Instrumentos / Válvulas / Disposit**	16,0d	14-Jun-28 08:00 AM	30-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
415		Instalar instrumentos nas bombas B-25124003 A / B	10,0d	14-Jun-28 08:00 AM	24-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
416		Efetuar testes B-25124003 A / B	4,0d	24-Jun-28 08:00 AM	28-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
417		Instalação Válvulas de Segurança PSV'S B-25124003 A / B	2,0d	28-Jun-28 08:00 AM	30-Jun-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
418		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5 Elétrica**	232,0d	01-Out-27 08:00 AM	20-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
419		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.7 BOMBAS J-4522 A / B**	189,0d	01-Out-27 08:00 AM	07-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
420		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.7.5 Montagem Aterramento**	2,0d	01-Out-27 08:00 AM	03-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
421		Montagem Aterramento J-4522 A / B	2,0d	01-Out-27 08:00 AM	03-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
422		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.7.3 Montagem Leitos e Eletrocalhas**	10,0d	16-Mar-28 08:00 AM	26-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
423		Montagem leitos e eletrocalhas J-4522 A / B	10,0d	16-Mar-28 08:00 AM	26-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
424		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.7.4 Montagem Eletrodutos**	10,0d	16-Mar-28 08:00 AM	26-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
425		Montagem de Eletrodutos J-4522 A / B	10,0d	16-Mar-28 08:00 AM	26-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
426		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.7.2 Montagem Cabos**	10,0d	26-Mar-28 08:00 AM	05-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
427		Montagem de Cabos J-4522 A / B	10,0d	26-Mar-28 08:00 AM	05-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
428		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.7.6 Montagem Seladora**	2,0d	05-Abr-28 08:00 AM	07-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
429		Montagem seladora Motores bombas J-4522 A / B	2,0d	05-Abr-28 08:00 AM	07-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
430		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.8 BOMBAS B-25124003 A / B**	10,0d	16-Mar-28 08:00 AM	26-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
431		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.8.4 Montagem Eletrodutos**	5,0d	16-Mar-28 08:00 AM	21-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
432		Montagem de Eletrodutos B-25124003 A / B	5,0d	16-Mar-28 08:00 AM	21-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
433		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.8.2 Montagem Cabos**	5,0d	21-Mar-28 08:00 AM	26-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
434		Montagem de Cabos B-25124003 A / B	5,0d	21-Mar-28 08:00 AM	26-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
435		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.2 SUBESTAÇÃO C-16**	10,0d	03-Out-27 08:00 AM	13-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
436		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.2.1 PN-1604 E 1605**	10,0d	03-Out-27 08:00 AM	13-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
437		ADEQUAÇÃO DO PAINEL PN-1604 E 1605 - 3 GAVETAS	10,0d	03-Out-27 08:00 AM	13-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
438		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.1 SUBESTAÇÃO C-18**	205,0d	03-Out-27 08:00 AM	25-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
439		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.1.1 Montagem Leito e eletrocalhas**	20,0d	13-Out-27 08:00 AM	02-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
440		Montagem de leitos	20,0d	13-Out-27 08:00 AM	02-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
441		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.1.2 Montagem Cabos**	165,0d	02-Nov-27 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
442		Conectorização / Testes	4,0d	02-Nov-27 08:00 AM	06-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
443		Lançamento de cabos - (alimentador da SE)	30,0d	16-Mar-28 08:00 AM	15-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
444		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.1.3 Inversores**	10,0d	15-Abr-28 08:00 AM	25-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
445		Re-alocar Inversores	10,0d	15-Abr-28 08:00 AM	25-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
446		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.1.4 PN-1801**	10,0d	03-Out-27 08:00 AM	13-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
447		Adequação cubiculo média do PN-1801	10,0d	03-Out-27 08:00 AM	13-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
448		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.3 SUBESTAÇÃO C-31**	230,0d	03-Out-27 08:00 AM	20-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
449		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.3.1 Montagem Leitos**	20,0d	13-Out-27 08:00 AM	02-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
450		Montagem de leitos	20,0d	13-Out-27 08:00 AM	02-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
451		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.3.2 Montagem Cabos**	150,0d	02-Nov-27 08:00 AM	31-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
452		Conectorização / Testes	2,0d	02-Nov-27 08:00 AM	04-Nov-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
453		Lançamento de cabos (alimentador SE)	15,0d	16-Mar-28 08:00 AM	31-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
454		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.3.3 PN-3101**	10,0d	31-Mar-28 08:00 AM	10-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
455		ADEQUAÇÃO DO CUBICULO DE MEDIA PN-3101	10,0d	31-Mar-28 08:00 AM	10-Abr-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
456		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.3.4 PN-3102**	10,0d	03-Out-27 08:00 AM	13-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		
457		ADEQUAÇÃO DO PAINEL PN-1604 E 1605 - 3 GAVETAS	10,0d	03-Out-27 08:00 AM	13-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D		

© Oracle Corporation

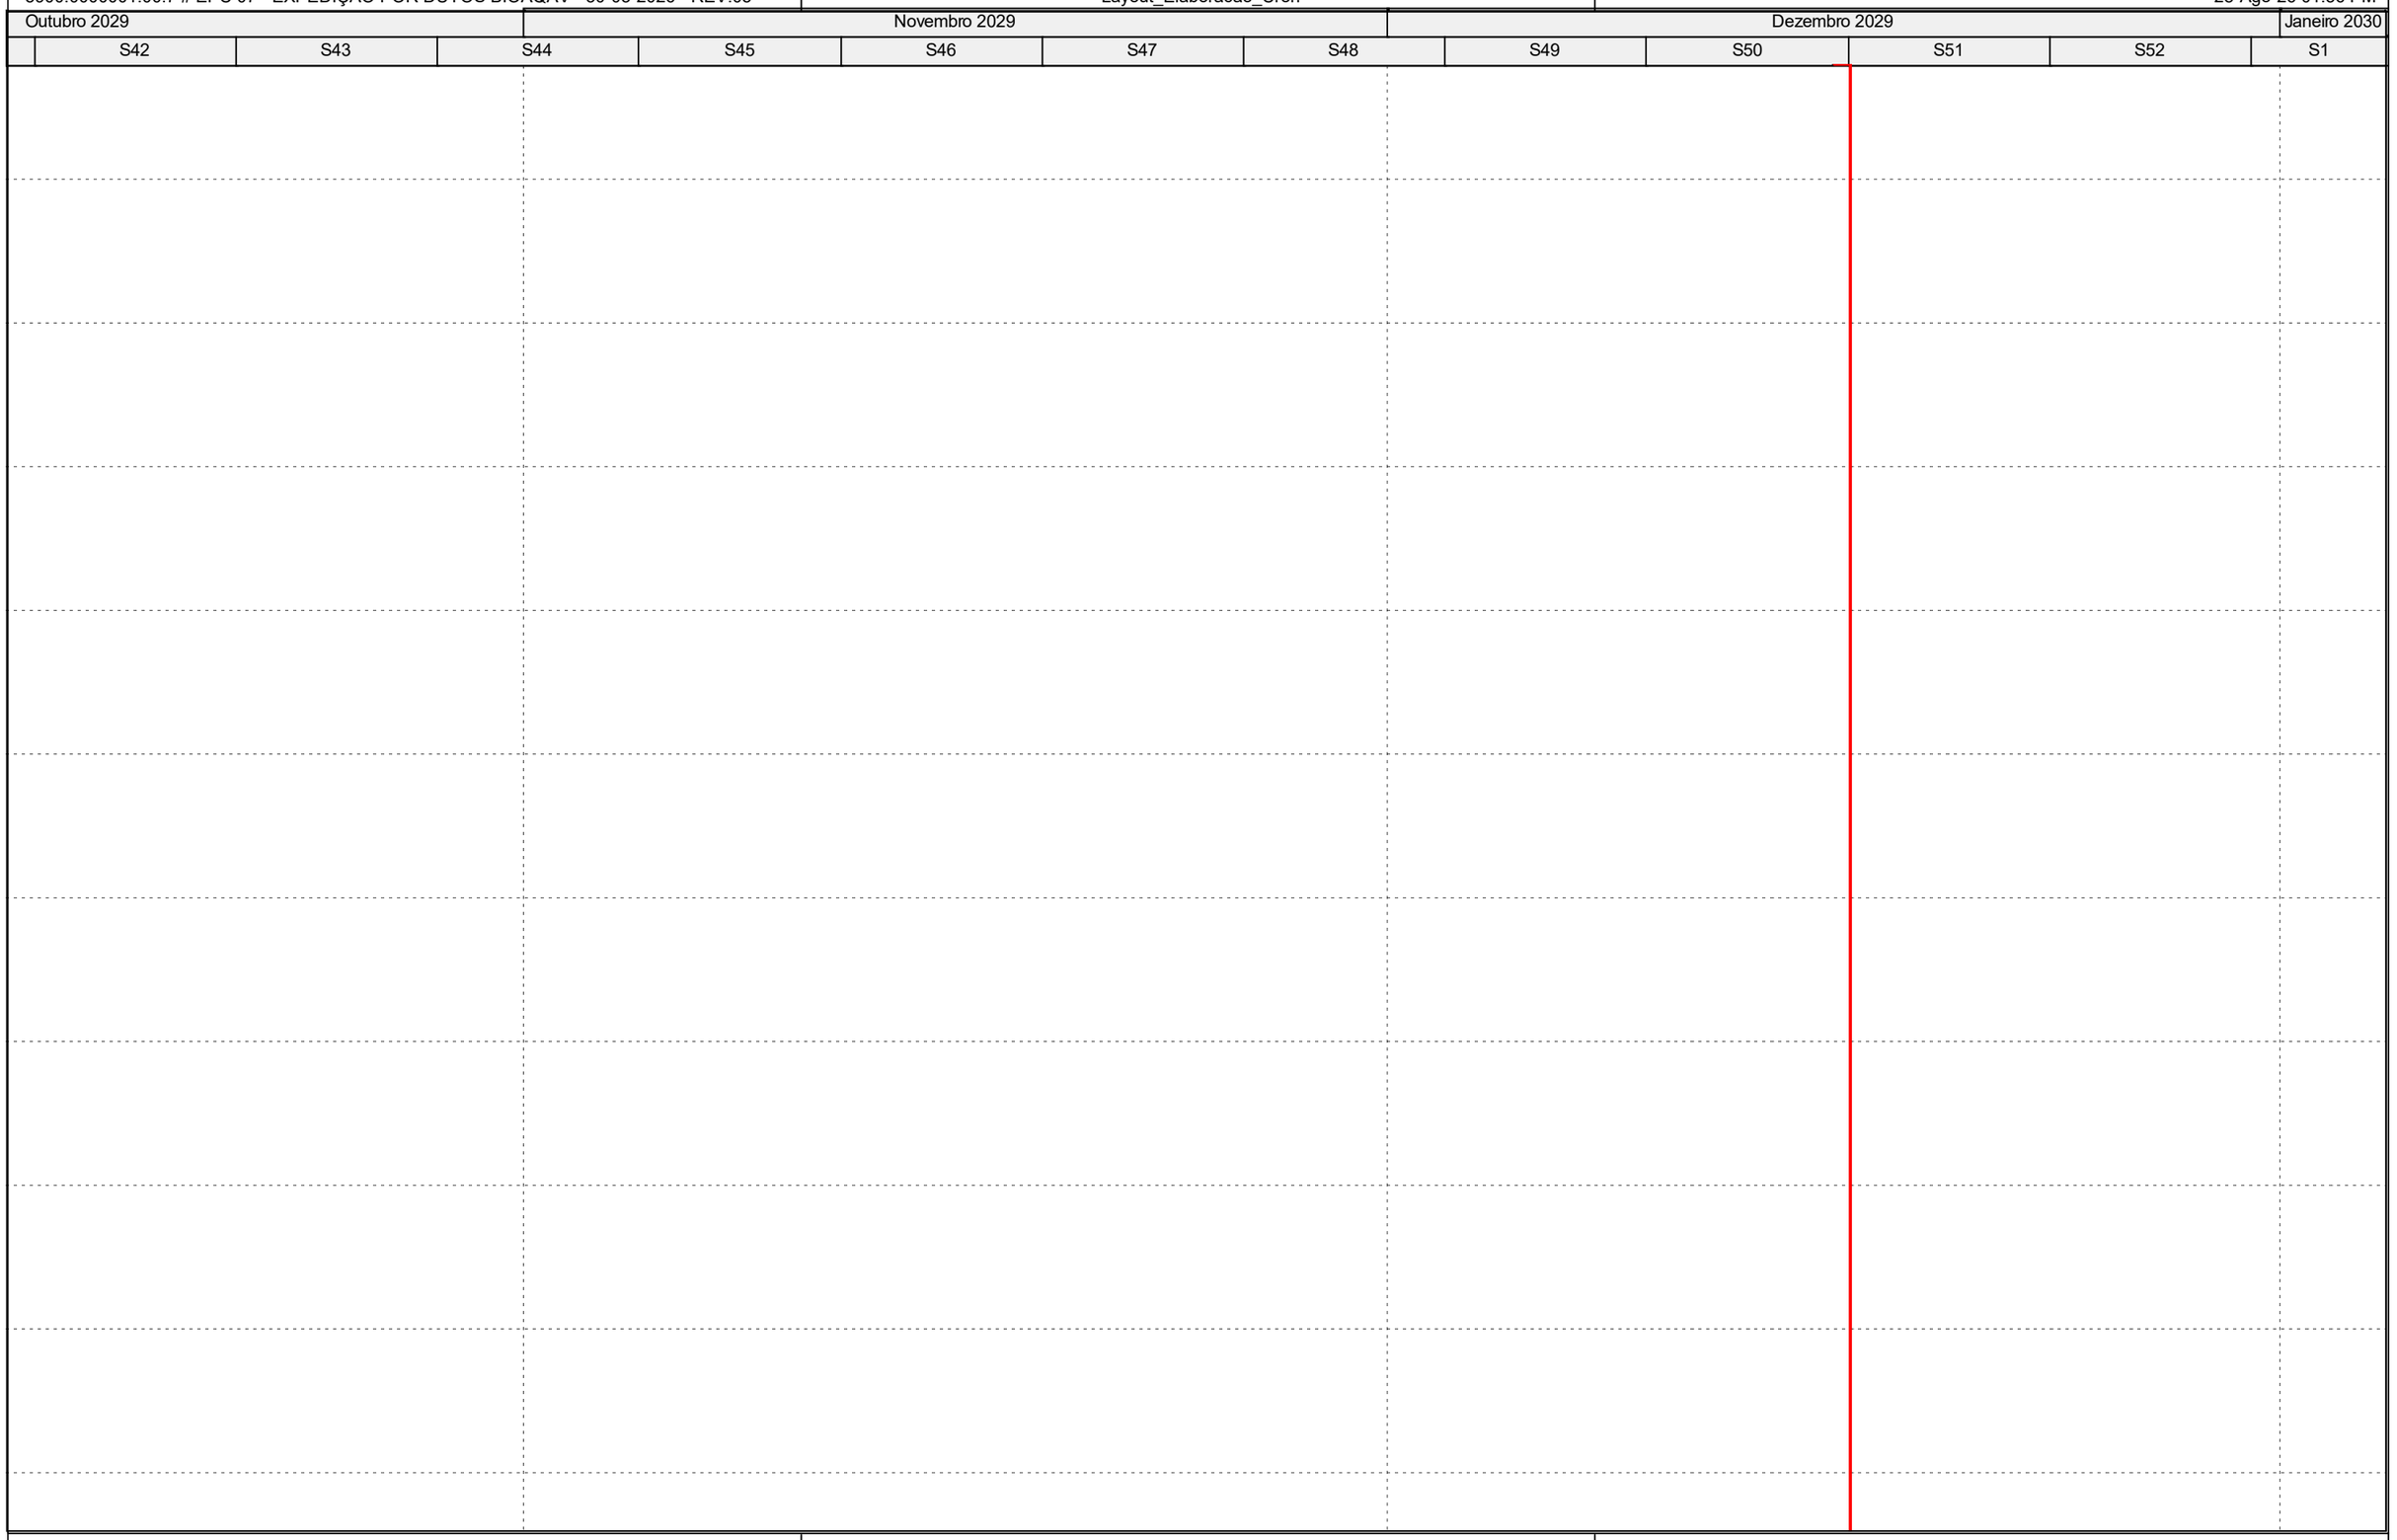

© Oracle Corporation

#	ID da Atividade	Nome da Atividade	Duração Original	Início	Término	Calendário
458		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.5.3.5 Transformador**	5,0d	15-Maio-28 08:00 AM	20-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
459		MONTAGEM TRANSFORMADOR TF-3101	5,0d	15-Maio-28 08:00 AM	20-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
460		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.4 Segurança**	69,0d	16-Mar-28 08:00 AM	24-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
461		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.4.1 Sistema de detecção de gás**	4,0d	20-Maio-28 08:00 AM	24-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
462	A	Instalação de detector de Hidrocarboneto	4,0d	20-Maio-28 08:00 AM	24-Maio-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
463		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.6.5.4.2 Montagem de cabos**	2,0d	16-Mar-28 08:00 AM	18-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
464	A	Lançamento de cabos - Casa de bombas AROE J-158 A / J-159 A	2,0d	16-Mar-28 08:00 AM	18-Mar-28 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
465		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.10 DESMONTAGEM**	546,0d	18-Set-27 08:00 AM	17-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
466		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.10.1 TUBULAÇÃO**	546,0d	18-Set-27 08:00 AM	17-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
467	A4720	Desmontagem bombas existentes J-4508	6,0d	18-Set-27 08:00 AM	24-Set-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
468	A4910	Desmontagem e remoção - Interligação Tanques P-104 E / F	15,0d	18-Set-27 08:00 AM	03-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
469	A4920	Desmontagem e remoção de linha desativada - RUA 6A	15,0d	18-Set-27 08:00 AM	03-Out-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
470	A4930	Desmontagem e remoção de linha - Piperack travessia Rua da CCL-AROE	10,0d	18-Set-27 08:00 AM	28-Set-27 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
471	A4721	Desmontagem bombas existentes J-4510	6,0d	11-Mar-29 08:00 AM	17-Mar-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
472		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.7 COMISSIONAMENTO E PARTIDA**	202,0d	18-Maio-29 08:00 AM	06-Dez-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
473	A1400	Condicionamento	60,0d	18-Maio-29 08:00 AM	17-Jul-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
474	A1410	Pré Operação (TTAS-1)	60,0d	17-Jul-29 08:00 AM	15-Set-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
475	A1420	Partida - EXPEDIÇÃO	2,0d	15-Set-29 08:00 AM	17-Set-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
476	A1550	Operação Assistida	60,0d	17-Set-29 08:00 AM	16-Nov-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
477	A1440	Transferência de Sistemas (TTAS-2)	10,0d	16-Nov-29 08:00 AM	26-Nov-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
478	A1450	Termo de Transferência da Instalação (TTI)	10,0d	26-Nov-29 08:00 AM	06-Dez-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
479		**RPBC-EXP-U6000-3-1-2.8 ENCERRAMENTO CONTRATUAL**	30,0d	16-Nov-29 08:00 AM	16-Dez-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D
480	A1470	Desmobilização	30,0d	16-Nov-29 08:00 AM	16-Dez-29 08:00 AM	[DRN01 - GLOBAL - CORRIDOS - 24 H/D

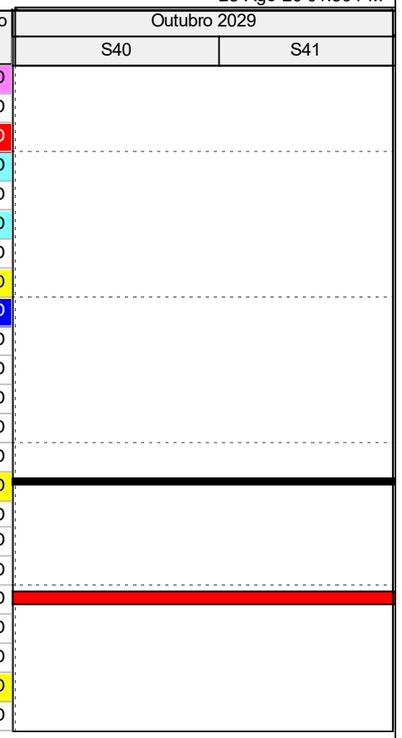

© Oracle Corporation

Outubro 2029 | Novembro 2029 | Dezembro 2029 | Janeiro 2030

S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1

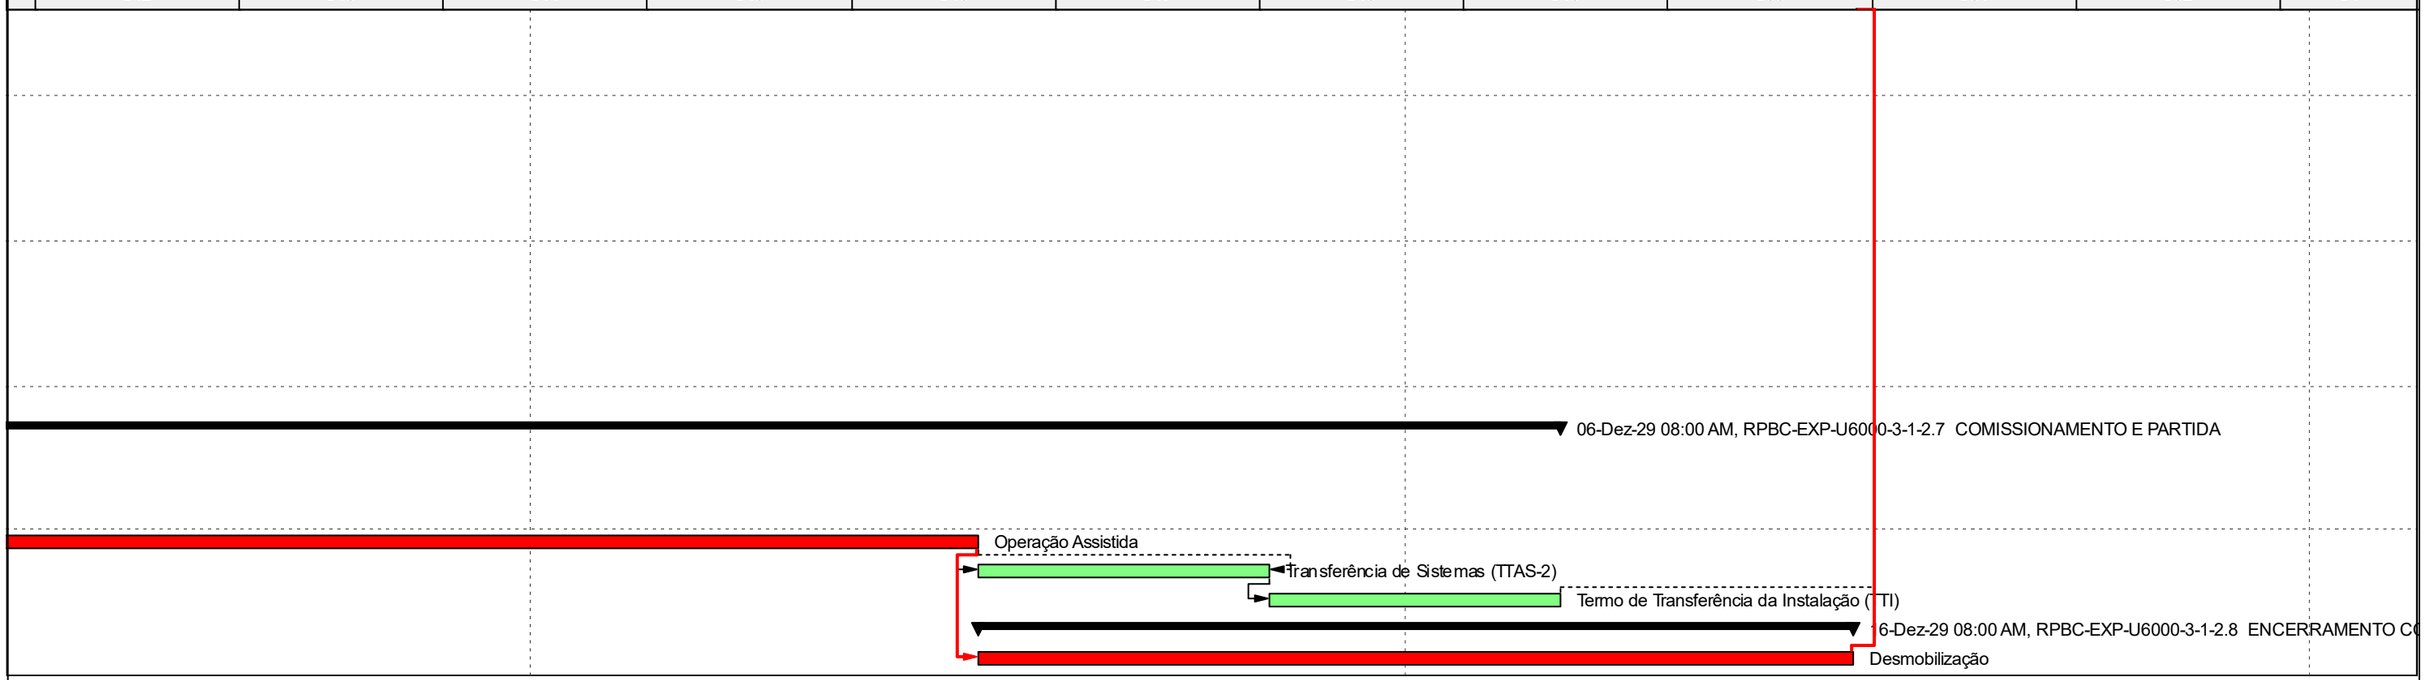

© Oracle Corporation
