PETROBRAS	**CRONOGRAMA FÍSICO**	Nº	**CR-4706.82-6500-91C-PTD-001**
	CLIENTE: TP/DDT/ENGDT/PPL/GPP/GP1		FOLHA 1 de 2
	PROGRAMA: GARGALOS LOGÍSTICOS NA ÁREA DO RIO		ANEXO II
	ÁREA: OLEODUTO CAMPOS ELISEOS/REDUC – OCER 16” II		NP-1
	TÍTULO: CRONOGRAMA DE METAS PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO - DUTO OCER 16" II		

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	
0	Emissão Original

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	09/07/2026								
PROJETO	TP/DPL1								
EXECUÇÃO	T2ZX								
VERIFICAÇÃO	T3P9								
APROVAÇÃO	T2FV								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-0381 REV. L.

PETROBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO	CR-4706.82-6500-91C-PTD-001
CLIENTE	TP/DDT/ENGDT/PPL/GPP/GP1
PROGRAMA	GARGALOS LOGÍSTICOS NA ÁREA DO RIO
ÁREA	OLEODUTO CAMPOS ELISEOS/REDUC – OCER 16" II
TÍTULO	CRONOGRAMA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO - DUTO OCER 16" II

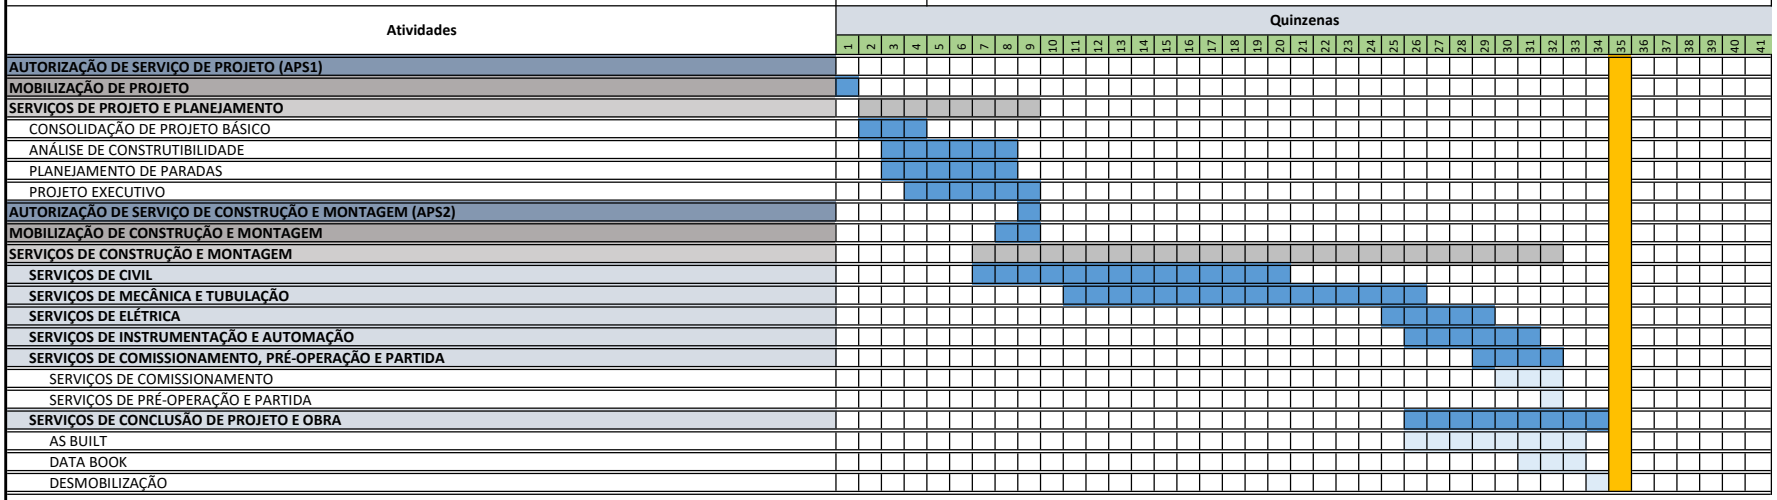

NOTA: O cronograma apresentado acima poderá ser revisado pela CONTRATADA, desde que respeitados os marcos parciais prioritários assinalados abaixo e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Marcos Parciais Contratuais	Dias corridos desde a autorização de serviço	Marco Parcial Prioritário
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO (APS1)	**0**	
MOBILIZAÇÃO DE PROJETO	15	
SERVIÇOS DE PROJETO E PLANEJAMENTO	135	
CONSOLIDAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	60	
ANÁLISE DE CONSTRUTIBILIDADE	120	
PLANEJAMENTO DE PARADAS	120	X
PROJETO EXECUTIVO	135	X
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM (APS2)	135	
MOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM	135	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM	480	
SERVIÇOS DE CIVIL	300	
SERVIÇOS DE MECÂNICA E TUBULAÇÃO	390	X
SERVIÇOS DE ELÉTRICA	435	
SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	465	
SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E PARTIDA	480	
SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO	480	
SERVIÇOS DE PRÉ-OPERAÇÃO E PARTIDA	480	X
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE PROJETO E OBRA	510	
AS BUILT	495	
DATA BOOK	495	
DESMOBILIZAÇÃO	510	
