PETROBRAS	**CRONOGRAMA**	Nº **CR-4300.01-6903-910-PTD-001**	
	CLIENTE: TP/DDT/DTSSPCO/UO-SPPCO/ISESP		FOLHA 1 de 2
	PROGRAMA: PÁTIO DE REÍDUOS		
	ÁREA: **TERMINAL DE BARUERI**		**NP-1**
TRANSPETRO DIRETORIA DE DUTOS E TERMINAIS	TÍTULO: **NOVO PÁTIO DE RESÍDUOS DE BARUERI**		**TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL1/ DP1**

ÍNDICE DE REVISÕES


REV.	
0	EMISSÃO ORIGINAL

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	20/05/2026								
PROJETO	PTD								
EXECUÇÃO	G21K								
VERIFICAÇÃO	UBS9								
APROVAÇÃO									

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-0381 REV. L.

PETROBRAS	**CRONOGRAMA**	**CR-4300.01-6903-910-PTD-001**
	CLIENTE	TP/DDT/DTSSPCO/UO-SPPCO/ISESP
	PROGRAMA	PÁTIO DE REÍDUOS
	ÁREA	TERMINAL DE BARUERI
	TÍTULO	NOVO PÁTIO DE RESÍDUOS DE BARUERI

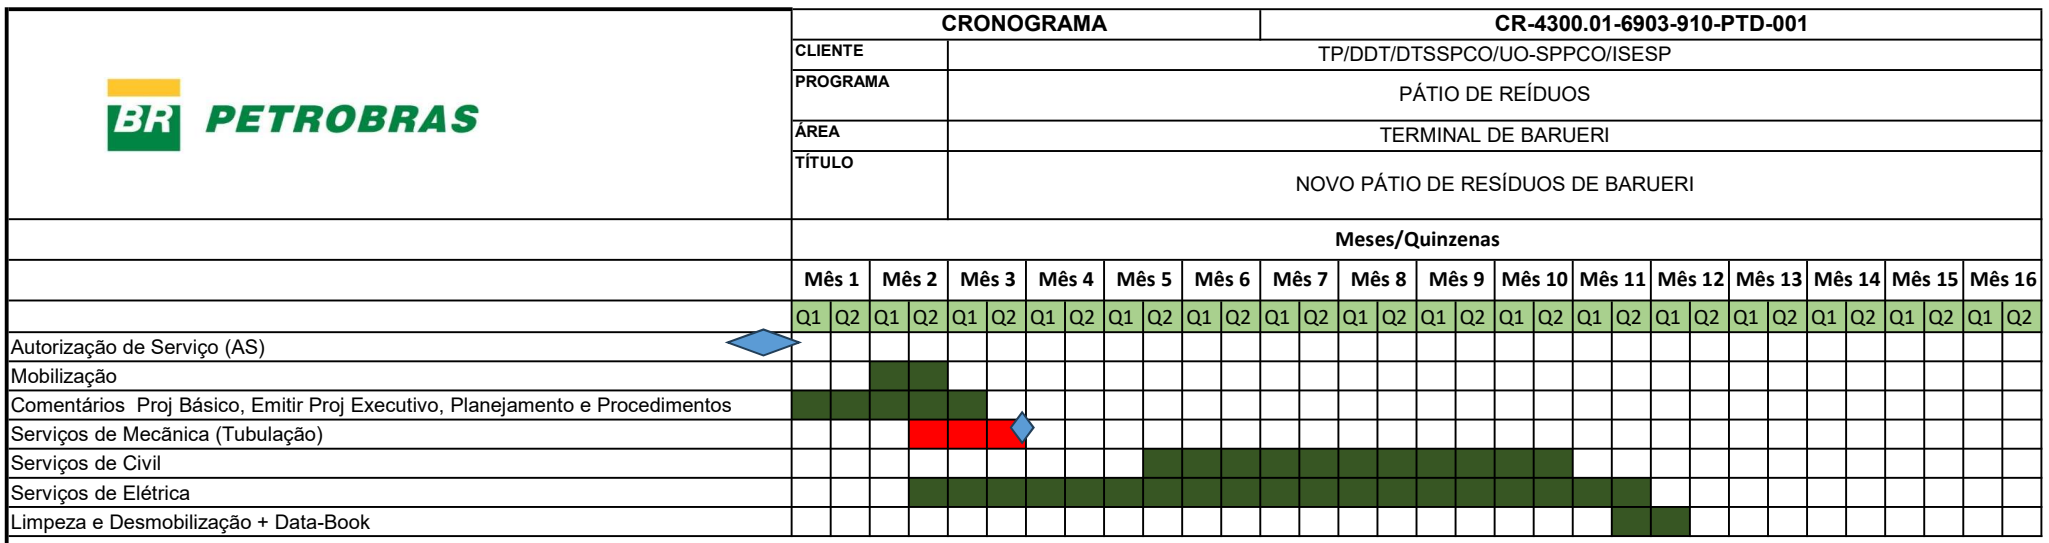

NOTA: O cronograma apresentado acima poderá ser revisado pela CONTRATADA, desde que respeitados os marcos parciais prioritários assinalados abaixo e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Marcos Parciais Contratuais	Dias corridos desde a autorização de AS	Marco Parcial Prioritário
Autorização de Serviço (AS)	0	X
Mobilização	60	
Comentários do Proj Básico, Emissão Projeto Executivo e Planejamento	75	
Serviços de Mecânica (Tubulação)	90	X
Serviços de Elétrica	300	
Serviços de Civil	330	
Limpeza e Desmobilização + Data-book	345	
